

【東日本大震災津波】 社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

策定の趣旨

◆ 被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、県民生活に身近な社会資本の整備に関する情報を定期的に提供

被災者や被災地の事業者が、今後の生活再建・事業再開等を具体的に検討するためには、県民生活に身近な社会資本の復旧・復興の工程についての情報が不可欠です。

また、本格復興の着実な推進を、目に見える形で広く情報発信する必要があります。このため、県では、県民生活に身近な社会資本（主要8分野）の復旧・復興事業の動きや今後の見通しについて情報提供を行うものです。

なお、記載している工程等は、様々な要因により変更となる可能性があることから、定期的に最新のデータに更新していきます。

ロードマップの構成

◆ 主要8分野について掲載

- ① 海岸保全施設
- ② 復興まちづくり
- ③ 復興道路等
- ④ 災害公営住宅
- ⑤ 漁港
- ⑥ 港湾
- ⑦ 医療（病院、医科診療所）
- ⑧ 教育（小学校、中学校、高等学校）

◆ 総括と市町村別の2種類で構成

1 総括表

- ① 復旧・復興事業の動き
- ② 分野別の着工・完成箇所割合
- ③ 事業計画掲載箇所一覧
- ④ 復旧・復興ロードマップの見方

2 市町村別工程表

- ① 各事業箇所の位置図
- ② 年度別の整備スケジュール

ロードマップの更新

◆ 更新頻度

事業計画の策定や許認可に関する手続き、復旧・復興事業に係る工事が具体的に進捗してきていることから、平成28年度からは9月30日と3月31日を基準日に定め、最新のデータに更新していきます。

◆ 工程上の主要課題

- ① 自治体職員の不足
 - ② 労働者や建設資材の調整
 - ③ 用地取得期間の長期化
- 公表している工程を達成するためには、上記課題の解決が必要です。

◆ 情報発信


社会資本の復旧・復興ロードマップは、これまでに公表したものと併せ、県のホームページに掲載しています。

(<http://www.pref.iwate.jp/anzen/machizukuri/18200/001811.html>)

復旧・復興事業の動き


◆ 前回の公表時点（基準日：平成27年12月31日）から、今回の更新までの期間の復興事業の進捗状況を工事の『着工』と『完成』に着目し整理しています。 全箇所数：757箇所

◆ 着工箇所数



※ 着工：0.9%増加し、全箇所の89.4%と89%


◆ 完成箇所数



※ 完成：1.0%増加し、全箇所の48%

分野別の着工・完成箇所割合

◆ 社会資本の主要8分野における分野別の『工事中箇所』と『完成箇所』及び『未着工箇所』の割合を整理しています。

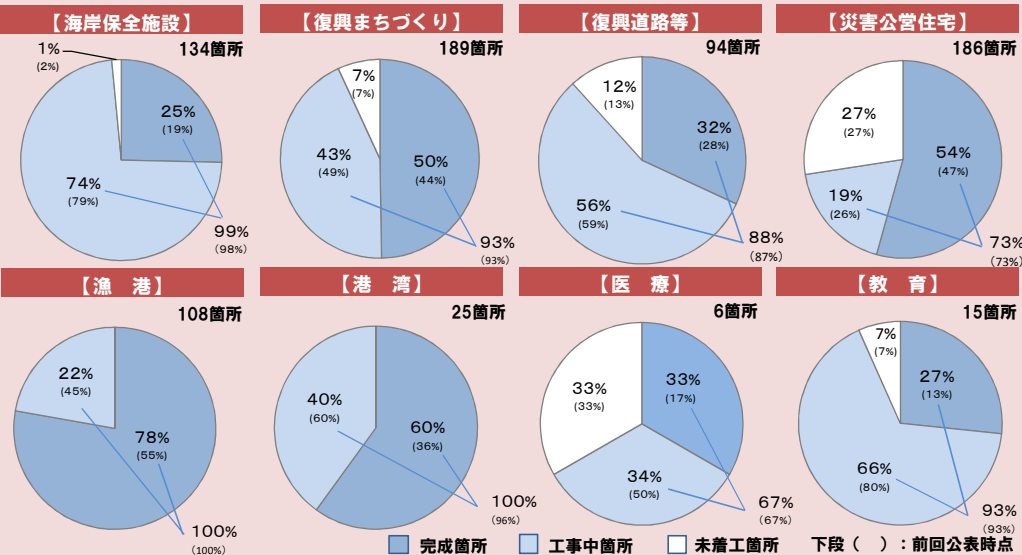

【お問い合わせ先】岩手県復興局まちづくり再生課（019-629-6935）

【東日本大震災津波】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

社会資本の復旧・復興ロードマップ

住宅再建のトピックス

宅地供給計画区画数 7,863区画（8,012区画から149区画の減少）

災害公営住宅計画戸数 5,771戸（前回公表から変更なし）

市町村別 事業計画掲載箇所一覧（全757箇所）

赤字は前回からの変更箇所

市町村名	事業 主体	海岸保全施設				復興まちづくり										復興道路等						災害公営住宅		漁 港	港 湾	医 療	教 育
		一般海岸 港湾海岸	農地海岸 林野海岸	漁港海岸	計	土地区画整理		防災集団移転		漁業集落防災		津波復興 拠点	面整備計			復興道路		復興支援道路		復興関連道路		箇所数	戸数	漁港数	地区数	箇所数	箇所数
		河川・海岸数	海岸数	海岸数	河川・海岸数	地区数	区画数	団地数	区画数	地区数	区画数	地区数	地区数	区画数	箇所数	路線数	区間・箇所数	路線数	区間・箇所数	路線数	区間・箇所数	箇所数		漁港数	地区数	箇所数	箇所数
洋野町	県	6	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	三陸沿岸 道路	-	-	-	2	2	-	-	1	2	-	-
	町	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	1	15	-		(国)1	-	-	-	-	1	4	8	-	-	-
	計	6	-	1	7	-	-	-	-	1	15	-	1	15	1		1	-	-	2	2	1	4	9	2	-	-
久慈市	県	5	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	-	1	1	2	2	-	-	1	4	-	-
	市	-	-	2	2	-	-	-	-	4	15	-	4	15	-		(国)2	-	-	-	-	3	11	9	1	-	-
	計	5	-	3	8	-	-	-	-	4	15	-	4	15	-		2	1	1	2	2	3	11	10	5	-	-
野田村	県	6	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	三陸沿岸 道路	-	-	-	1	2	2	26	1	-	-	-
	村	-	-	-	-	1	124	2	38	2	15	-	5	177	-		(国)1	-	-	-	-	4	74	2	-	-	-
	計	6	2	-	8	1	124	2	38	2	15	-	5	177	2		1	-	-	1	2	6	100	3	-	-	-
普代村	県	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
	村	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-		(国)3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	計	4	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-		3	-	-	1	1	-	-	5	-	-	-
田野畑村	県	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	三陸沿岸 道路	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-
	村	-	-	1	1	-	-	-	-	2	53	-	2	53	-		(国)3	-	-	-	-	5	63	3	-	-	-
	計	2	-	2	4	-	-	-	-	2	53	-	2	53	3		3	-	-	1	3	5	63	4	-	-	-
岩泉町	県	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	-	2	3	-	-	-	-	1	1	-	-
	町	-	-	1	1	-	-	-	-	1	59	-	1	59	-		(国)1	-	-	-	-	2	51	1	-	1	2
	計	2	-	2	4	-	-	-	-	1	59	-	1	59	-		1	2	3	-	-	2	51	2	1	1	2
宮古市	県	13	2	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	三陸沿岸道 路、宮古盛 岡横断道路	1	1	3	3	3	12	349	3	7	-	-
	市	-	-	3	3	2	410	5	263	9	32	2	18	705	-		(国)7	-	-	-	-	16	417	15	1	1	-
	計	13	2	4	19	2	410	5	263	9	32	2	18	705	7		8	1	3	3	3	28	766	18	8	1	-
山田町	県	4	3	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	三陸沿岸 道路	-	1	1	-	-	10	416	4	-	1	-
	町	-	-	1	1	4	661	4	400	2	144	1	11	1,205	-		(国)2	-	-	-	-	11	361	2	-	-	1
	計	4	3	5	12	4	661	4	400	2	144	1	11	1,205	1		2	1	1	-	-	21	777	6	-	1	1
大槌町	県	2	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	三陸沿岸 道路	-	-	-	1	1	9	483	2	-	1	-
	町	-	-	-	-	4	954	17	438	4	12	2	27	1,404	-		(国)1	-	-	-	-	27	479	-	-	-	2
	計	2	1	2	5	4	954	17	438	4	12	2	27	1,404	1		1	-	-	1	1	36	962	2	-	1	2
釜石市	県	6	3	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	三陸沿岸道 路、東北横 断自動車道 釜石秋田線	-	1	1	3	3	8	373	6	1	-	-
	市	-	-	7	7	4	1,097	11	135	14	87	2	31	1,319	-		(国)3	-	-	-	-	37	941	9	1	-	4
	計	6	3	12	21	4	1,097	11	135	14	87	2	31	1,319	5		3	1	1	3	3	45	1,314	15	2	-	4
大船渡市	県	7	3	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	三陸沿岸 道路	-	-	-	2	2	10	511	6	6	-	-
	市	-	-	8	8	1	231	23	366	1	30	1	26	627	-		(国)2	-	-	-	-	17	290	16	1	-	3
	計	7	3	13	23	1	231	23	366	1	30	1	26	627	5		2	-	-	2	2	27	801	22	7	-	3
陸前高田市	県	8	2	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	三陸沿岸 道路	-	-	-	2	2	5	626	3	-	1	1
	市	-	-	6	6	2	1,772	26	512	-	-	2	30	2,284	-		(国)2	-	-	-	-	6	269	9	-	1	2
	計	8	2	9	19	2	1,772	26	512	-	-	2	30	2,284	7		2	-	-	2	2	11	895	12	-	2	3
全体	県	65	16	24	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	3路線	1	6	9	18	21	56	2,784	31	21	3	1
	市町村	-	-	29	29	18	5,249	88	2,152	41	462	10	157	7,863	-		(国)28	-	-	-	-	130※	2,987※	77	4	3	14
	計	65	16	53	134	18	5,249	88	2,152	41	462	10	157	7,863	32		35※	6	38※	18	21	186※	5,771※	108	25	6	15

※ 復興道路等と災害公営住宅の全体の箇所数には、その他の市町村の箇所数を含んでいます。

【東日本大震災津波】社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

分野別 整備スケジュール

※ 全ての箇所を網羅して記載




（参考）市町村別工程表の見方（宮古市の例から抜粋表示）

■分野区分

県民生活に身近な主要8分野を記載。

■海岸保全施設の細分項目


- ・港湾海岸は、港湾区域に隣接するなど、港湾管理者が管理する海岸。
- ・農地海岸は、背後に農地を有する海岸。
- ・林野海岸は、防潮林などの保安林を有する海岸。
- ・漁港海岸は、漁港区域に隣接するなど、漁港管理者が管理する海岸。
- ・一般海岸は、上記以外の海岸のうち、海岸保全区域に指定された海岸。

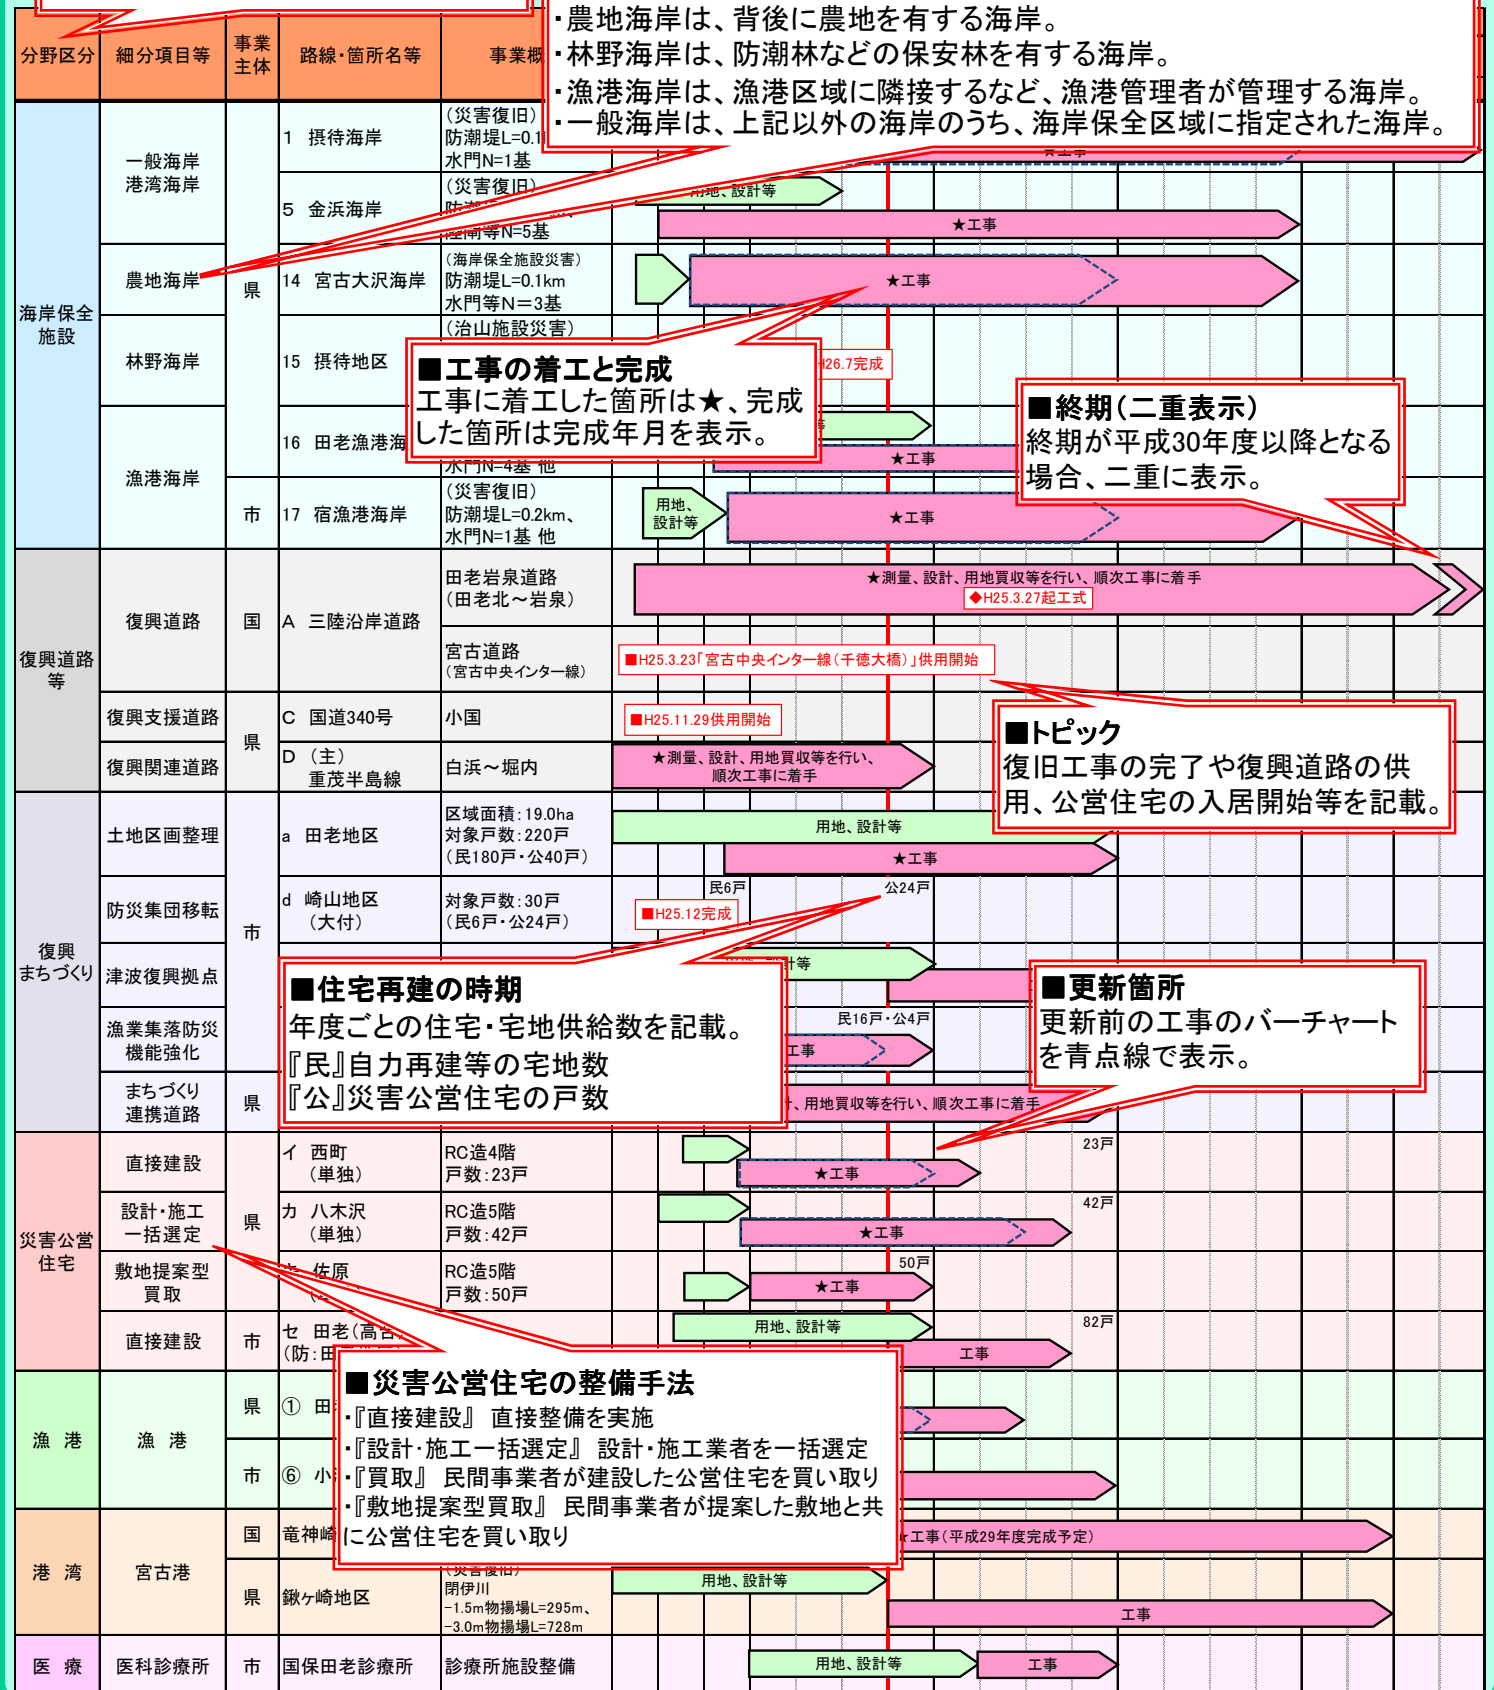

社会資本の復旧・復興ロードマップ【洋野町】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

海と高原の絆、未来へ 確かな復興

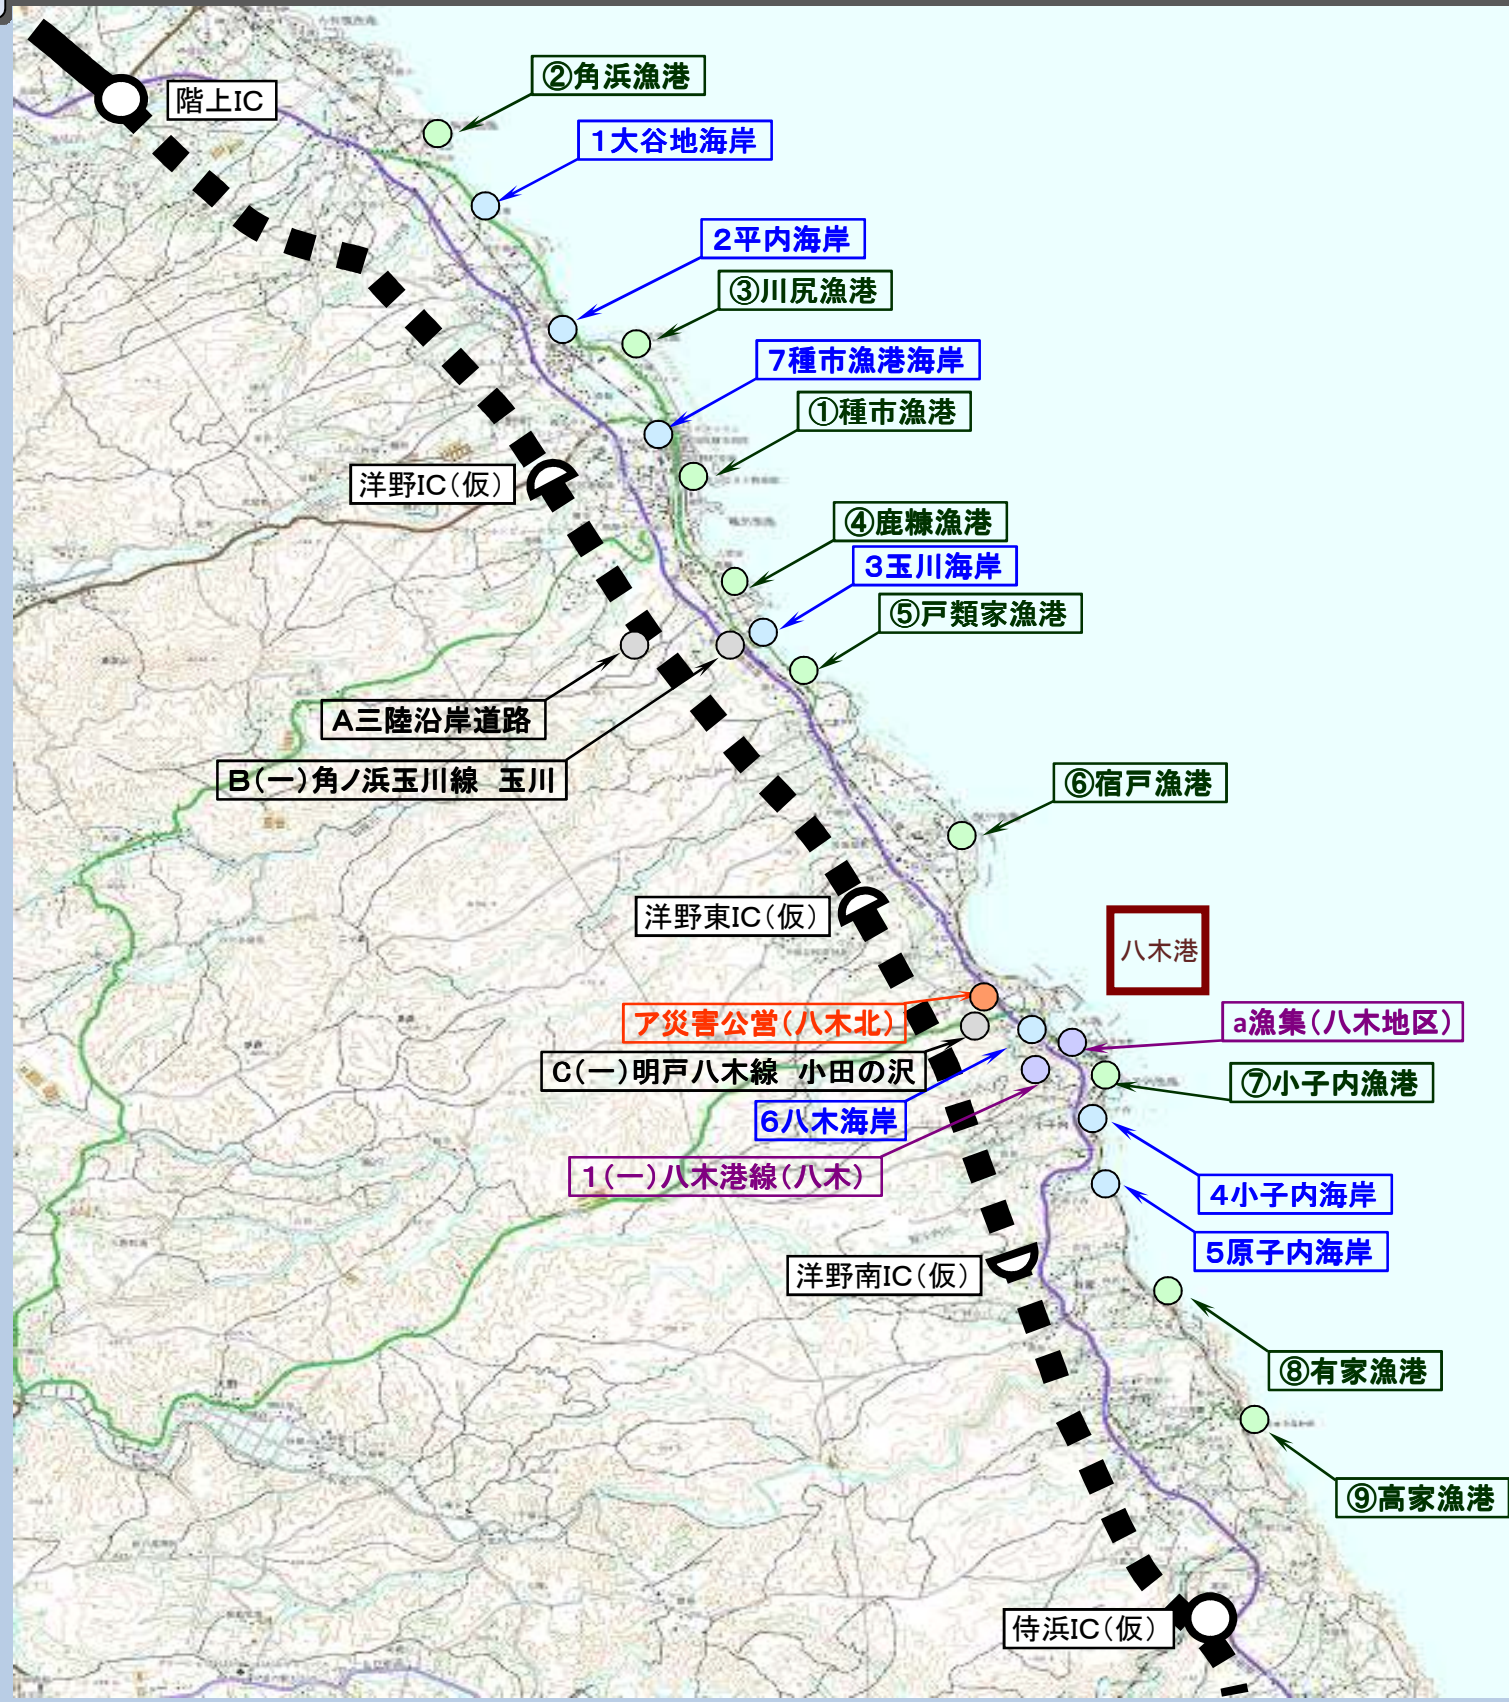


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール							
					第1期 （基盤復興期間）		第2期 （本格復興期間）			第3期 （更なる展開への連結期間）		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
海岸保全 施設	一般海岸	県	1 大谷地海岸	（災害復旧） 根固工V=92m ³ 他	■H24.12完成							
			2 平内海岸	（災害復旧） 消波工L=220m	■H25.10完成							
			3 玉川海岸	（災害復旧） 護岸L=87m 他	■H24.11完成							
			4 小内海岸	（災害復旧） 監視カメラ1台 他	■H24.8完成							
			5 原子内海岸	（災害復旧） 根固工V=92m ³ 他	■H24.5完成							
			6 八木海岸	（海岸高潮） 防潮堤L=0.4km、 水門等N=3基	用地設計等	★工事						
	漁港海岸		7 種市漁港海岸	（災害復旧） 陸間N=1基、 水門N=1基 他	■H24.3完成							
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	洋野階上道路 （待浜～階上）	◆H25.9.12起工式	★用地買収、工事等						
	復興関連道路	県	B（一） 角ノ浜玉川線	玉川					■H28.3.29供用開始			
			C（一） 明戸八木線	小田の沢				測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手				
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	町	a 八木	対象戸数：15戸 （民15戸）	用地、設計等					民15戸		
	まちづくり連携道路	県	1（一）八木港線	八木				★工事 ◆H27.11着工				
災害公営住宅	直接建設	町	A 八木北（単独）	木造平屋 戸数：4戸	■H25.8完成							
漁港	漁港	町	① 種市漁港	（漁港災害） 防波堤L=106m 他	■H24.9完成							
			② 角浜漁港	（漁港災害） 防波堤L=10m	■H24.3完成							
			③ 川尻漁港	（漁港災害） 護岸N=1式 他	■H24.3完成							
			④ 鹿糠漁港	（漁港災害） 船揚場L=22m 他	■H24.3完成							
			⑤ 戸類家漁港	（漁港災害） 船揚場N=1式	■H24.3完成							
			⑥ 宿戸漁港	（漁港災害） 防波堤L=69m、 船揚場L=8m 他	■H24.12完成							
			⑦ 小内漁港	（漁港災害） 防波堤L=101m、 岸壁L=14m 他	■H25.1完成							
			⑧ 有家漁港	（漁港災害） 防波堤L=85m 他	■H25.1完成							
			⑨ 高家漁港	（漁港災害） 防波堤L=45m 他	■H24.11完成							
港湾	八木港	県	北港地区	（災害復旧） 防波堤L=162m、 4.5m岸壁L=159m 他	■H26.3完成							
			南港地区	（災害復旧） 第2防波堤L=13m、 1号護岸L=57.8m	■H26.3完成							

社会資本の復旧・復興ロードマップ【久慈市1/2】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

新たな視点による 新たなまちづくり

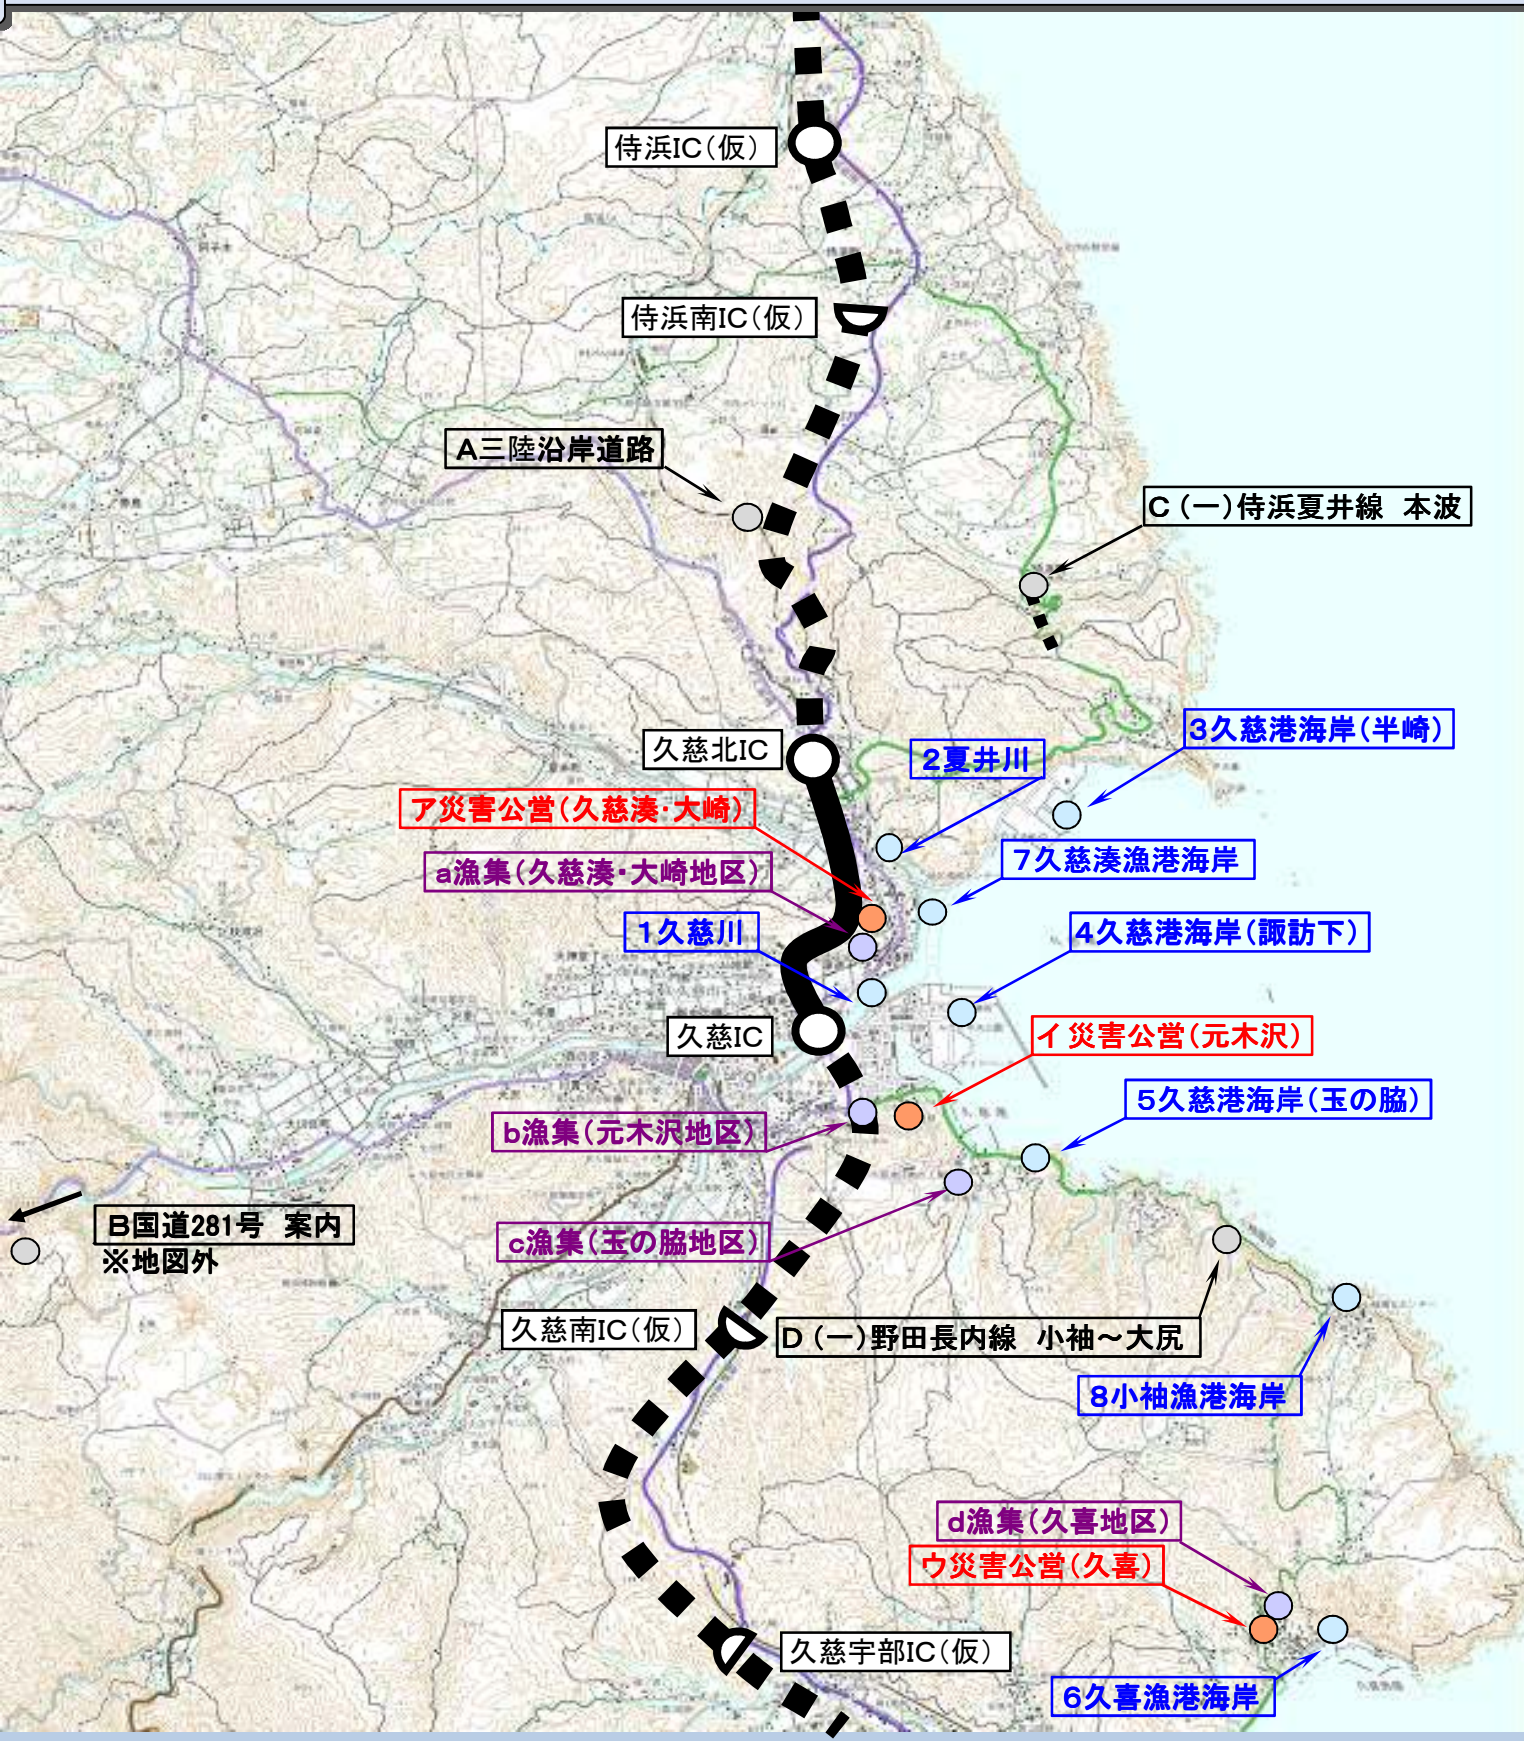


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 （基盤復興期間）			第2期 （本格復興期間）				第3期 （更なる展開への連結期間）				
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30	
海岸保全 施設	一般海岸	県	1 久慈川	（三陸高潮） 防潮堤L=2.0km	用地、設計等		★工事									
			2 夏井川	（三陸高潮） 防潮堤L=0.8km	用地、設計等		★工事									
	港湾海岸		3 久慈港海岸（半崎）	（災害復旧） 離岸堤L=0.2km	■H24.10完成											
			4 久慈港海岸（諏訪下）	（災害復旧） 防潮堤L=2.6km、 陸間N=12基			■H28.3完成									
			5 久慈港海岸（玉の脇）	（災害復旧） 離岸堤L=0.4km	■H24.10完成											
	漁港海岸		6 久喜漁港海岸	（災害復旧） 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	用地、設計等		★工事									
			7 久慈湊漁港海岸	（災害復旧） 防潮堤L=1.3km、 水門N=4基	用地、設計等		★工事									
			8 小袖漁港海岸	（災害復旧） 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他			■H28.3完成									
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	久慈北道路（侍浜～久慈北）	★用地買収、工事等											
				野田久慈道路（普代～久慈）	◆H25.6.27起工式		★用地買収、工事等									
	復興支援助路	県	B 国道281号	案内	◆H25.12着工		★工事									
			復興関連道路	C （一）侍浜夏井線	本波	■H24.9.30供用開始										
D （一）野田長内線	小袖～大尻			★工事												
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	市	a 久慈湊・大崎	対象戸数：14戸 （民9戸・公5戸）	民9戸・公5戸		■H26.3完成									
			b 元木沢	対象戸数：5戸 （民2戸・公3戸）	民2戸・公3戸		■H25.11完成									
			c 玉の脇	対象戸数：3戸 （民3戸）	民3戸		■H25.11完成									
			d 久喜	対象戸数：4戸 （民1戸・公3戸）	民1戸・公3戸		■H25.8完成									
災害公営住宅	直接建設	市	ア 久慈湊・大崎 （漁：久慈湊・大崎地区）	木造 戸数：5戸	5戸		■H26.3完成									
			イ 元木沢 （漁：元木沢地区）	木造 戸数：3戸	3戸		■H26.3完成									
			ウ 久喜 （漁：久喜地区）	木造 戸数：3戸	3戸		■H25.12完成									

社会資本の復旧・復興ロードマップ【野田村】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

安全・安心で活力あるむらづくり

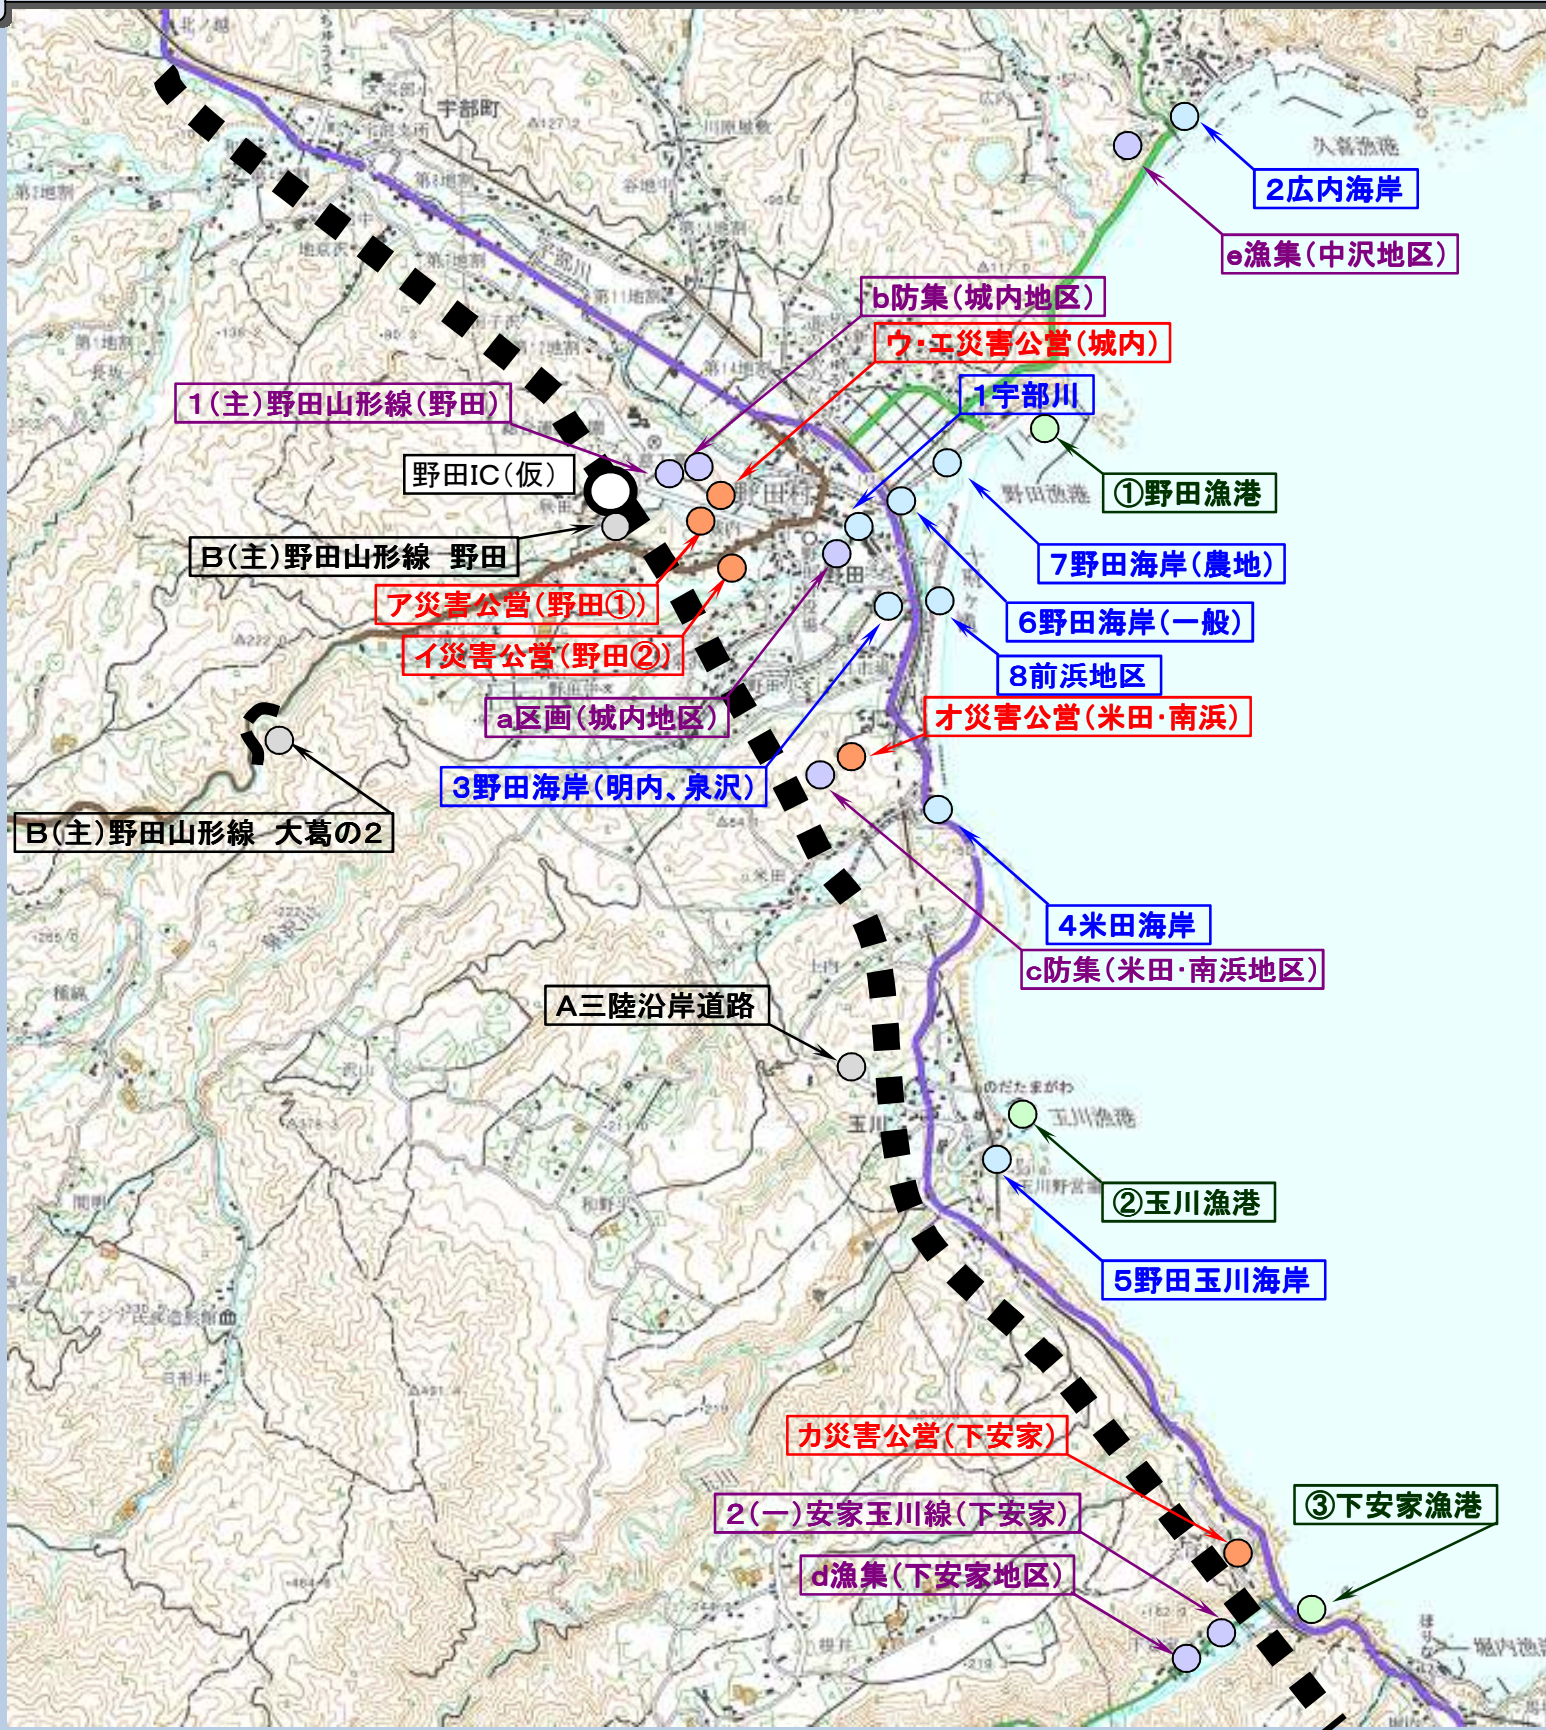

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇部川	(災害復旧) 水門設備1式他	■H26.3完成										
			2 広内海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=4基他	用地、設計等		★工事								
			3 野田海岸 (明内、泉沢)	(災害復旧) 水門設備等1式他	■H25.3完成										
			4 米田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=2基他 (海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等		★工事								
			5 野田玉川海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.05km他 (海岸高潮)	■H25.5完成										
			6 野田海岸	防潮堤L=0.5km、 水門等N=1基			★工事								
	農地海岸	7 野田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤裏法面 A=2,320m ² 、 水門操作室N=1棟	■H24.8完成											
	林野海岸	8 前浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=1.3km			★工事									
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	野田久慈道路 (昔代〜久慈)	◆H25.6.27起工式		★用地買収、工事等								
	復興関連道路	県	B (主) 野田山形線	大葛の2	■H25.7.2供用開始										
復興まちづくり	土地区画整理	村	a 城内地区	区域面積:12.9ha 対象戸数:137戸 (民124戸・公13戸)	用地、設計等		民22戸		民13戸・公13戸		民63戸		民26戸		
			b 城内地区	対象戸数:74戸 (民20戸・公54戸)					民20戸		公54戸				
	c 米田・南浜地区		対象戸数:24戸 (民18戸・公6戸)			民18戸				公6戸					
	d 下安家地区		対象戸数:14戸 (民13戸・公1戸)					民9戸		民4戸・公1戸					
	e 中沢地区		対象戸数:2戸 (民2戸)							民2戸					
	まちづくり 連携道路	県	1 (主)野田山形線	野田			◆H25.1着工		★用地買収等を行い、順次工事に着手						
			2 (一)安家玉川線	下安家			◆H25.10着工		★用地買収等を行い、順次工事に着手						
	災害公営住宅	直接建設	県	ア 野田① (単独)	木造2階 戸数:8戸	8戸		■H25.3完成							
				イ 野田② (単独)	木造 戸数:18戸	18戸		■H26.1完成							
			村	ウ 城内 (区:城内地区)	木造 戸数:13戸					13戸		■H27.3完成			
エ 城内 (防:城内地区)				木造 戸数:54戸							54戸		■H28.3完成		
オ 米田・南浜 (防:米田・南浜地区)				木造 戸数:6戸							6戸		■H26.7完成		
カ 下安家 (漁:下安家地区)				木造 戸数:1戸							1戸		■H26.7完成		
漁 港				漁 港	県	① 野田漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=307m 他	■H26.3完成							
村				② 玉川漁港	(漁港災害) 防波堤L=132m、 岸壁L=50m 他	■H24.9完成									
	③ 下安家漁港	(漁港災害) 防波堤L=28m 他	■H24.9完成												


基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 （基礎復興期間）			第2期 （本格復興期間）						第3期 （更なる展開への連結期間）	
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇留部海岸	（災害復旧） 水門設備1式 他	■ H25.10完成										
			2 太田名部海岸	（災害復旧） 防潮堤L=0.1km 他	■ H24.10完成										
			3 宇留部海岸	（県単治水事業） 陸間N=1基	■ H25.10完成										
			4 太田名部海岸	（海岸危機） 陸間等遠隔操作化 N=2基						■ H28.3完成					
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	野田久慈道路 （普代～久慈）	◆ H25.6.27起工式 ★用地買収、工事等										
				普代道路 （普代バイパス）	■ H25.10.13供用開始										
				尾肝要普代道路 （尾肝要～普代）	◆ H25.11.18起工式 ★用地買収、工事等										
	復興関連道路	県	B （一） 普代小屋瀬線	芦渡の2					◆ H27.11着工 ★工事						
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	村	a 堀内、沢地区	避難路				■ H27.3完成							
漁 港	漁 港	県	① 堀内漁港	（漁港災害） 防波堤N=1式 他	■ H25.10完成										
			② 太田名部漁港	（漁港災害） 防波堤L=285m、 岸壁L=36m 他	■ H25.10完成										
		村	③ 沢漁港	（漁港災害） 防波堤L=77m 他	■ H25.7完成										
			④ 白井漁港	（漁港災害） 防波堤L=89m、 岸壁L=7m 他	■ H24.6完成										
			⑤ 黒崎漁港	（漁港災害） 泊地N=1式	■ H23.9完成										

社会資本の復旧・復興ロードマップ【岩泉町】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

心はひとつ いのちの海に 未来を拓く岩泉

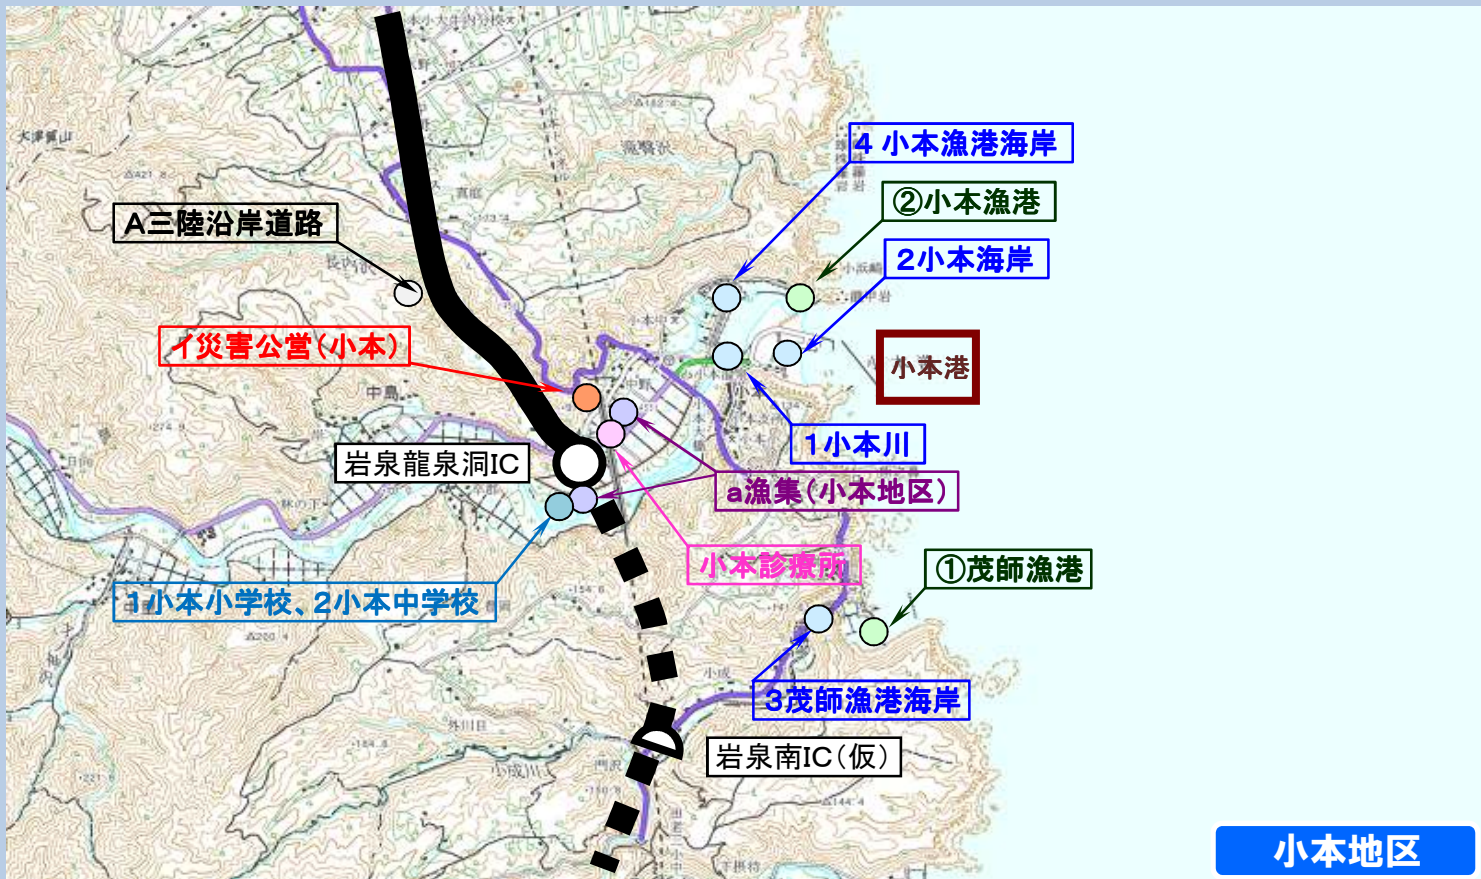

小本地区



岩泉地区



安家地区

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール												
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)						第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30		
海岸保全施設	一般海岸	県	1 小本川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.2km								■H28.3完成					
			2 小本海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km	■H25.3完成												
	漁港海岸	町	3 茂師漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、 水門N=1基 他	用地、 設計等	★工事											
			4 小本漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	■H25.3完成												
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	田老岩泉道路 (田老北～岩泉)	★用地買収、工事等 ◆H25.3.27起工式												
	復興支援道路	県	B (主) 久慈岩泉線	龍泉洞	■H24.8.28供用開始												
				大月峠	◆H25.12着工	★工事											
			C (国)340号	押角峠 <small>※宮古市の復興支援道路・国道340号押角峠と同一箇所</small>				★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						◆H27.8着工			
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	町	a 小本地区	対象戸数:59戸 (民59戸)					民59戸	■H27.3完成							
災害公営住宅	直接建設	町	ア 森の越 (単独)	木造 戸数:15戸			15戸										
			イ 小本 (単独)	木造 戸数:20戸 RC造 戸数:16戸	■H25.5完成			36戸									
漁港	漁港	県	① 茂師漁港	(漁港災害) 防波堤L=493m、 岸壁L=280m 他						■H27.3完成							
		町	② 小本漁港	(漁港災害) 防波堤L=103m、 岸壁L=844m 他						■H27.3完成							
港湾	小本港	県	小本浜地区	(港湾災害復旧) 防波堤L=871m、 岸壁L=119m、 物揚場L=105m他						■H27.9完成							
医療	医師診療所	町	小本診療所	診療所施設整備						■H27.12完成							
教育	小学校	町	1 小本小学校	(災害復旧) 移転						■H28.3完成							
	中学校		2 小本中学校	(災害復旧) 移転						■H28.3完成							

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市1/4】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29
海岸保全 施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 摂待海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、 水門N=1基	用地、設計等		★工事							
			2 田老海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 水門等N=4基 (海岸危機) 水門等遠隔操作化 N=1基			★工事							
			3 神林海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門等N=7基 (海岸危機) 陸閘等遠隔操作化 N=1基	用地、設計等		★工事							
			4 高浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 陸閘等N=4基 (港湾高潮) 防潮堤L=0.9km (海岸危機) 陸閘等遠隔操作化 N=4基			★工事							
			5 金浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.2km、 陸閘等N=5基	用地、設計等		★工事							
			6 赤前海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、 樋門N=1基			★工事							
			7 里海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 樋門N=1基			★工事							
			8 宮古港海岸 (藤原)	(港湾高潮・災害) 防潮堤L=2.2km、 陸閘N=4基	用地、設計等		★工事							
			9 宮古港海岸 (高浜)	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 陸閘N=1基	用地、設計等		★工事							
			10 宮古港海岸 (鍛ヶ崎)	(港湾高潮) 防潮堤L=1.6km	用地、設計等		★工事							
			11 田代川	(災害復旧) 水門N=1基	用地、設計等		★工事							
			12 閉伊川	(災害復旧) 水門N=1基	用地、設計等		★工事 H32完成予定							
			13 津軽石川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.9km			★工事							
	農地海岸		14 宮古大沢海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.1km 水門等N=3基			★工事							
	林野海岸		15 摂待地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤) L=0.3km			■H26.7完成							
	漁港海岸	市	16 田老 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 水門N=4基 他	用地、設計等		★工事							
			17 宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	用地、設計等		★工事							
			18 津軽石 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 水門N=1基 他	用地、設計等		★工事							
			19 白浜(宮古) 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	用地、設計等		★工事							


基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	田老岩泉道路 (田老北～岩泉)	★用地買収、工事等 ◆H25.3.27起工式										
				宮古田老道路 (宮古中央～田老北)	◆H24.11.18起工式 ★用地買収、工事等 ※田老第2IC～田老北IC H29開通予定、宮古中央IC～田老第2IC H32開通予定										
				宮古道路 (宮古中央インター線)	■H25.3.23「宮古中央インター線(千徳大橋)」供用開始										
				山田宮古道路 (山田～宮古南)	★用地買収、工事等 ◆H25.6.17起工式										
			B 宮古盛岡 横断道路	宮古箱石道路 (宮古～箱石)	◆H25.11.30起工式 ★用地買収、工事等 ※宮古市下川井地区 H31開通予定、宮古市藤原～松山IC H32開通予定										
				平津戸松草道路 (平津戸・岩井～松草)	★用地買収、工事等 ◆H26.8.24起工式										
				区界道路 (区界～築川)	★用地買収、工事等 ◆H26.8.24起工式										
				宮古西道路	★用地買収、工事等										
	復興支援道路	県	C 国道340号	小国	■H25.11.29供用開始										
				和井内道路	★工事										
				立丸峠	◆H26.3着工 ★工事										
				押角峠 ※岩泉町の復興支援道路・国道340号押角峠と同一箇所	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.8着工										
	復興関連道路		D (主) 重茂半島線	白浜～堀内	■H27.3.31供用開始										
			E 宮古市道 北部環状線	山口	★工事										
			F (一) 津軽石停車場線	津軽石	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手										
	復興まちづくり	土地区画整理		a 田老地区	区域面積：19.0ha 対象戸数：220戸 (民180戸・公40戸)			民64戸		民116戸・公40戸		■H28.3完成			
					b 鉾ヶ崎・ 光岸地地区	区域面積：23.8ha 対象戸数：270戸 (民230戸・公40戸)	用地、設計等								
				★工事											
c 田老地区				対象戸数：230戸 (民159戸・公71戸)			民12戸		民141戸・公40戸		民77戸				
防災集団移転			d 崎山地区 (大付)	対象戸数：30戸 (民6戸・公24戸)	民6戸		公24戸		民159戸・公71戸		■H27.9完成				
			e 高浜・金浜 地区	対象戸数：52戸 (民40戸・公12戸)					民40戸・公12戸		■H28.3完成				
			f 法之脇地区 (津軽石)	対象戸数：12戸 (民12戸)	民12戸						■H26.3完成				
			g 赤前地区	対象戸数：46戸 (民46戸)	民19戸		民23戸		民4戸		■H28.3完成				
			h 津軽石地区	区域面積：約1.2ha	用地、設計等				★工事						
				i 中心市街地 地区	区域面積：約1.6ha	用地、設計等								工事	
津波復興拠点		市	j 摂待地区	対象戸数：3戸 (民3戸)	民3戸		■H25.7完成								
			k 小堀内地区	対象戸数：2戸 (民2戸)	民2戸		■H26.3完成								
			l 浦の沢・ 追切地区	対象戸数：2戸 (民2戸)	民2戸		■H25.3完成								
			m 音部地区	対象戸数：3戸 (民3戸)			■H26.7完成		民3戸						
			n 重茂地区	対象戸数：21戸 (民17戸・公4戸)			■H27.3完成		民16戸		民1戸、公4戸				
			o 千鶏地区	対象戸数：3戸 (民3戸)	民3戸		■H25.12完成								
			p 女遊戸地区	集落道他	用地、設計等				★工事						
			q 石浜地区	対象戸数：2戸 (民2戸)			■H26.7完成		民2戸						
			r 田老野原地区	集落道、用地造成					用地、設計等				工事		

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市3/4】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

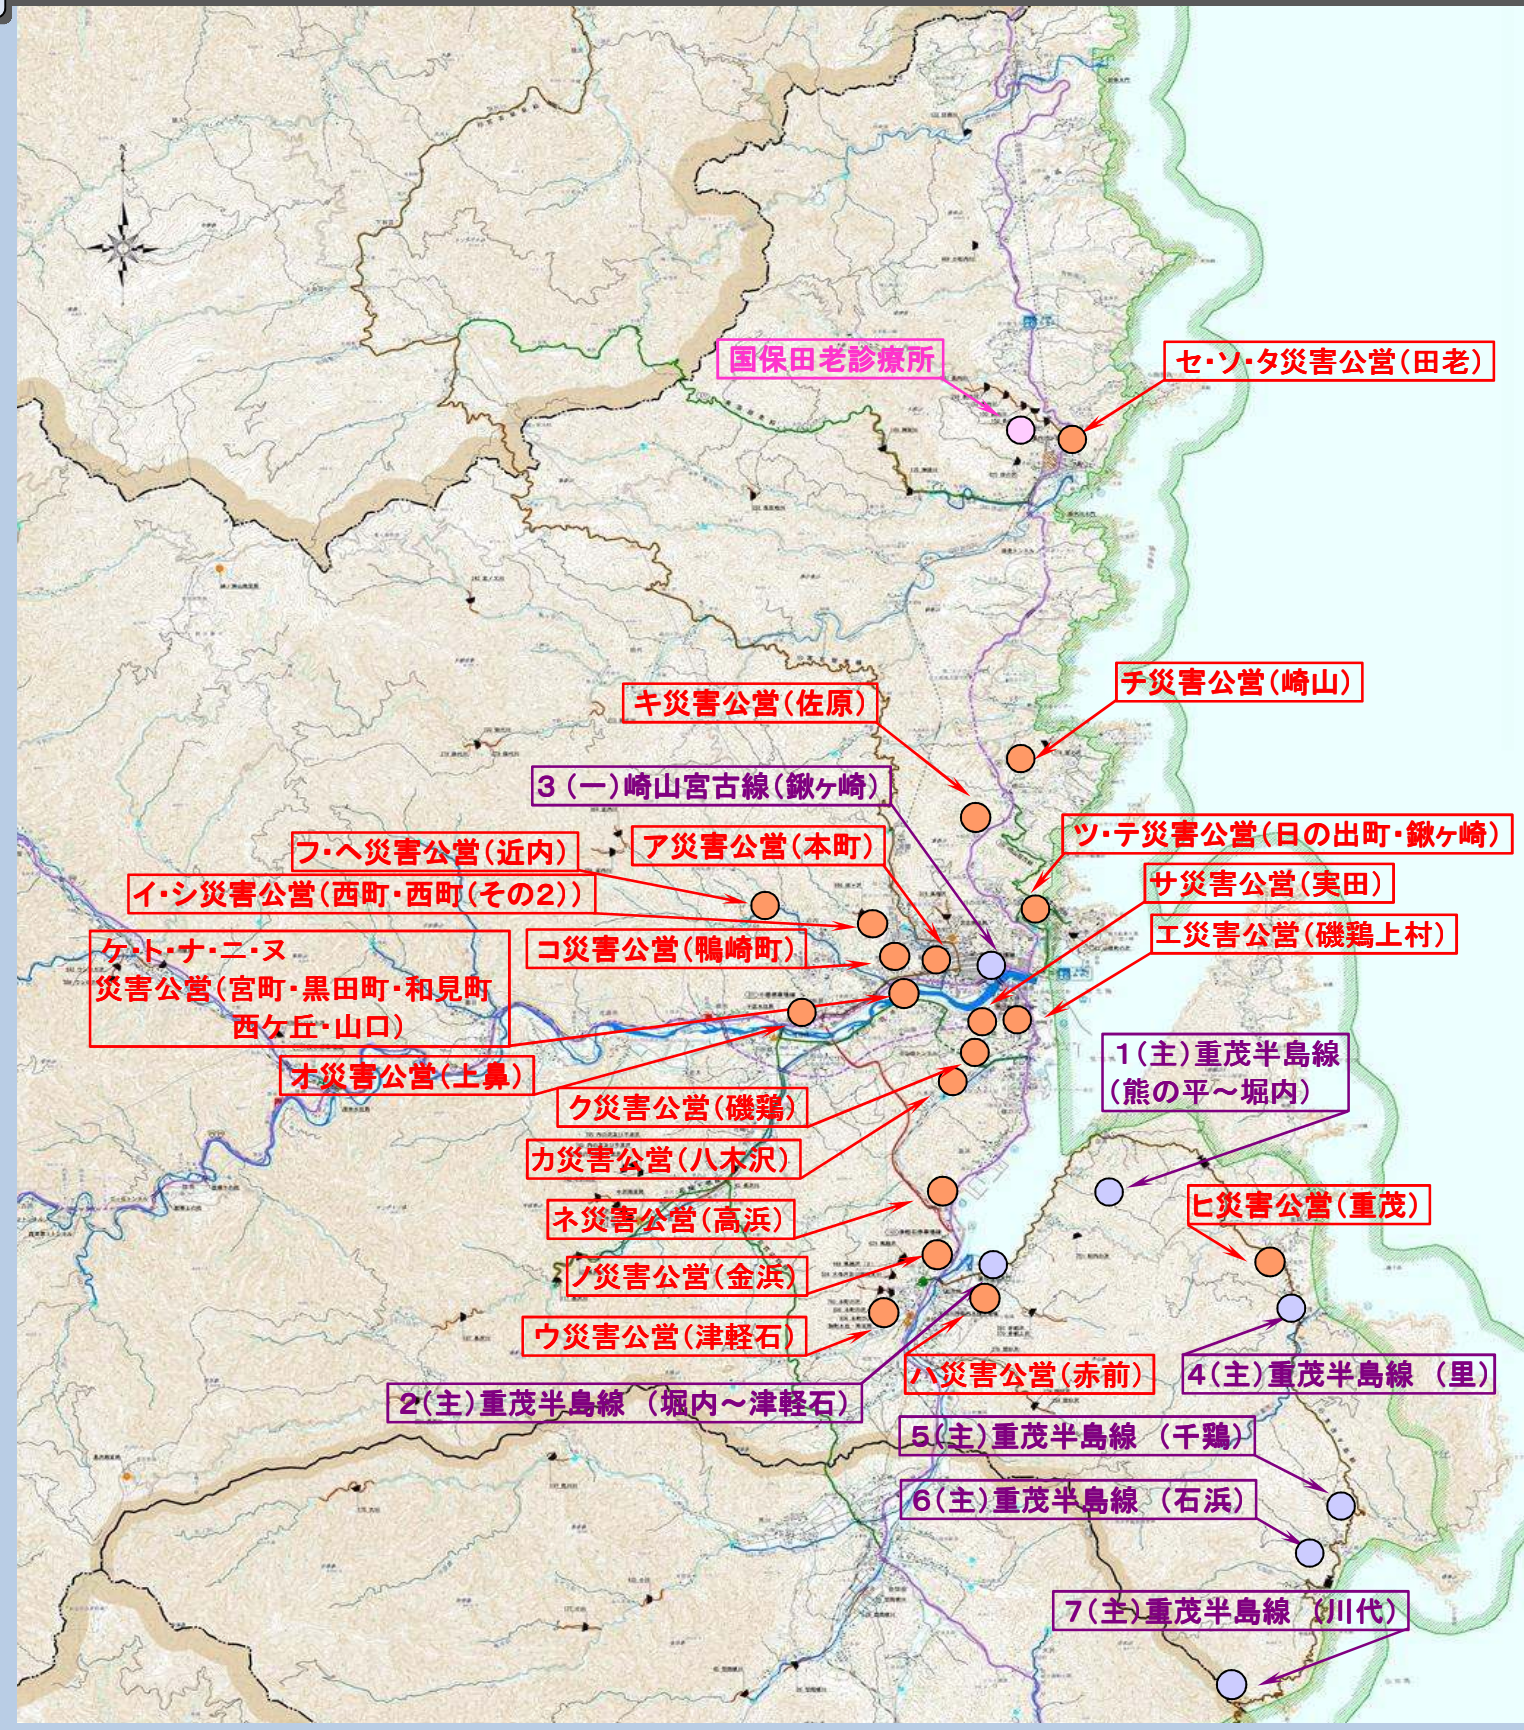


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	まちづくり 連携道路	県	1 (主)重茂半島線	熊の平～堀内					★用地買収等を行い、順次工事に着手	◆H27.10着工				
			2 (主)重茂半島線	堀内～津軽石					★用地買収等を行い、順次工事に着手	◆H27.12着工				
			3 (一)崎山宮古線	鍛ヶ崎					測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
			4 (主)重茂半島線	里					★用地買収等を行い、順次工事に着手	◆H27.9着工				
			5 (主)重茂半島線	千鷲					★工事	◆H27.8着工				
			6 (主)重茂半島線	石浜					測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
			7 (主)重茂半島線	川代					★工事	◆H27.9着工				
災害公営 住宅	直接建設	県	ア 本町 (単独)	RC造8階 戸数:34戸						■H27.9完成			34戸	
			イ 西町 (単独)	RC造4階 戸数:23戸						■H27.6完成			23戸	
			ウ 津軽石 (単独)	RC造5階 戸数:35戸						■H27.7完成			35戸	
			エ 磯鶏上村 (単独)	RC造4階 戸数:24戸								■H28.3完成	24戸	
	設計・施工 一括選定	県	オ 上鼻 (単独)	RC造4階 戸数:24戸						■H27.7完成			24戸	
			カ 八木沢 (単独)	RC造5階 戸数:42戸						■H27.10完成			42戸	
			キ 佐原 (単独)	RC造5階 戸数:50戸					■H27.2完成			50戸		
			ク 磯鶏 (単独)	S造2階 戸数:30戸					■H27.3完成			30戸		
	敷地提案型 買収	県	ケ 宮町 (単独)	S造3階 戸数:20戸					■H27.3完成			20戸		
			コ 鴨崎町 (単独)	S造3階 戸数:20戸								■H27.9完成	20戸	
			サ 実田 (単独)	S造3階 戸数:17戸						■H27.7完成			17戸	
			シ 西町(その2) (単独)	RC造5階 戸数:30戸						■H27.6完成			30戸	
			セ 田老(高台) (防:田老地区)	木造 戸数:36戸						■H27.10完成			36戸	
			ソ 田老 (区:田老地区)	RC造5階 戸数:40戸						■H27.11完成			40戸	
			タ 田老(高台Ⅱ) (防:田老地区)	木造 戸数:35戸								■H28.3完成	35戸	
			チ 崎山 (防:崎山地区)	RC造4階 戸数:24戸						■H27.3完成			24戸	
市	直接建設	市	ツ 日の出町 (単独)	木造2階 戸数:26戸						■H27.4完成			26戸	
			テ 鍛ヶ崎 (区:鍛ヶ崎地区)	RC造5階 戸数:40戸								■H27.12完成	40戸	
			ト 黒田町 (単独)	RC造5階 戸数:24戸						■H27.8完成			24戸	
			ナ 和見町 (単独)	RC造5階 戸数:23戸						■H27.3完成			23戸	
			ニ 西ヶ丘 (単独)	RC造4階 戸数:24戸								■H27.4完成	24戸	
			ヌ 山口 (単独)	RC造4階 戸数:23戸								用地、設計等		23戸
			ノ 高浜 (単独)	木造2階 戸数:12戸						■H26.4完成			12戸	
			ハ 金浜 (防:金浜地区)	木造2階 戸数:12戸								■H27.11完成	12戸	
			ヒ 赤前 (単独)	木造2階 戸数:14戸						■H26.11完成			14戸	
			ヒ 重茂 (漁:重茂地区)	木造 戸数:4戸						■H27.6完成			4戸	
	買収	市	フ 近内① (単独)	RC造5階 戸数:40戸						■H26.3完成			40戸	
			ヘ 近内② (単独)	RC造5階 戸数:40戸								■H27.3完成	40戸	
医療	医師診療所	市	国保田老診療所	診療所施設整備								用地、設計等		★工事

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市4/4】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

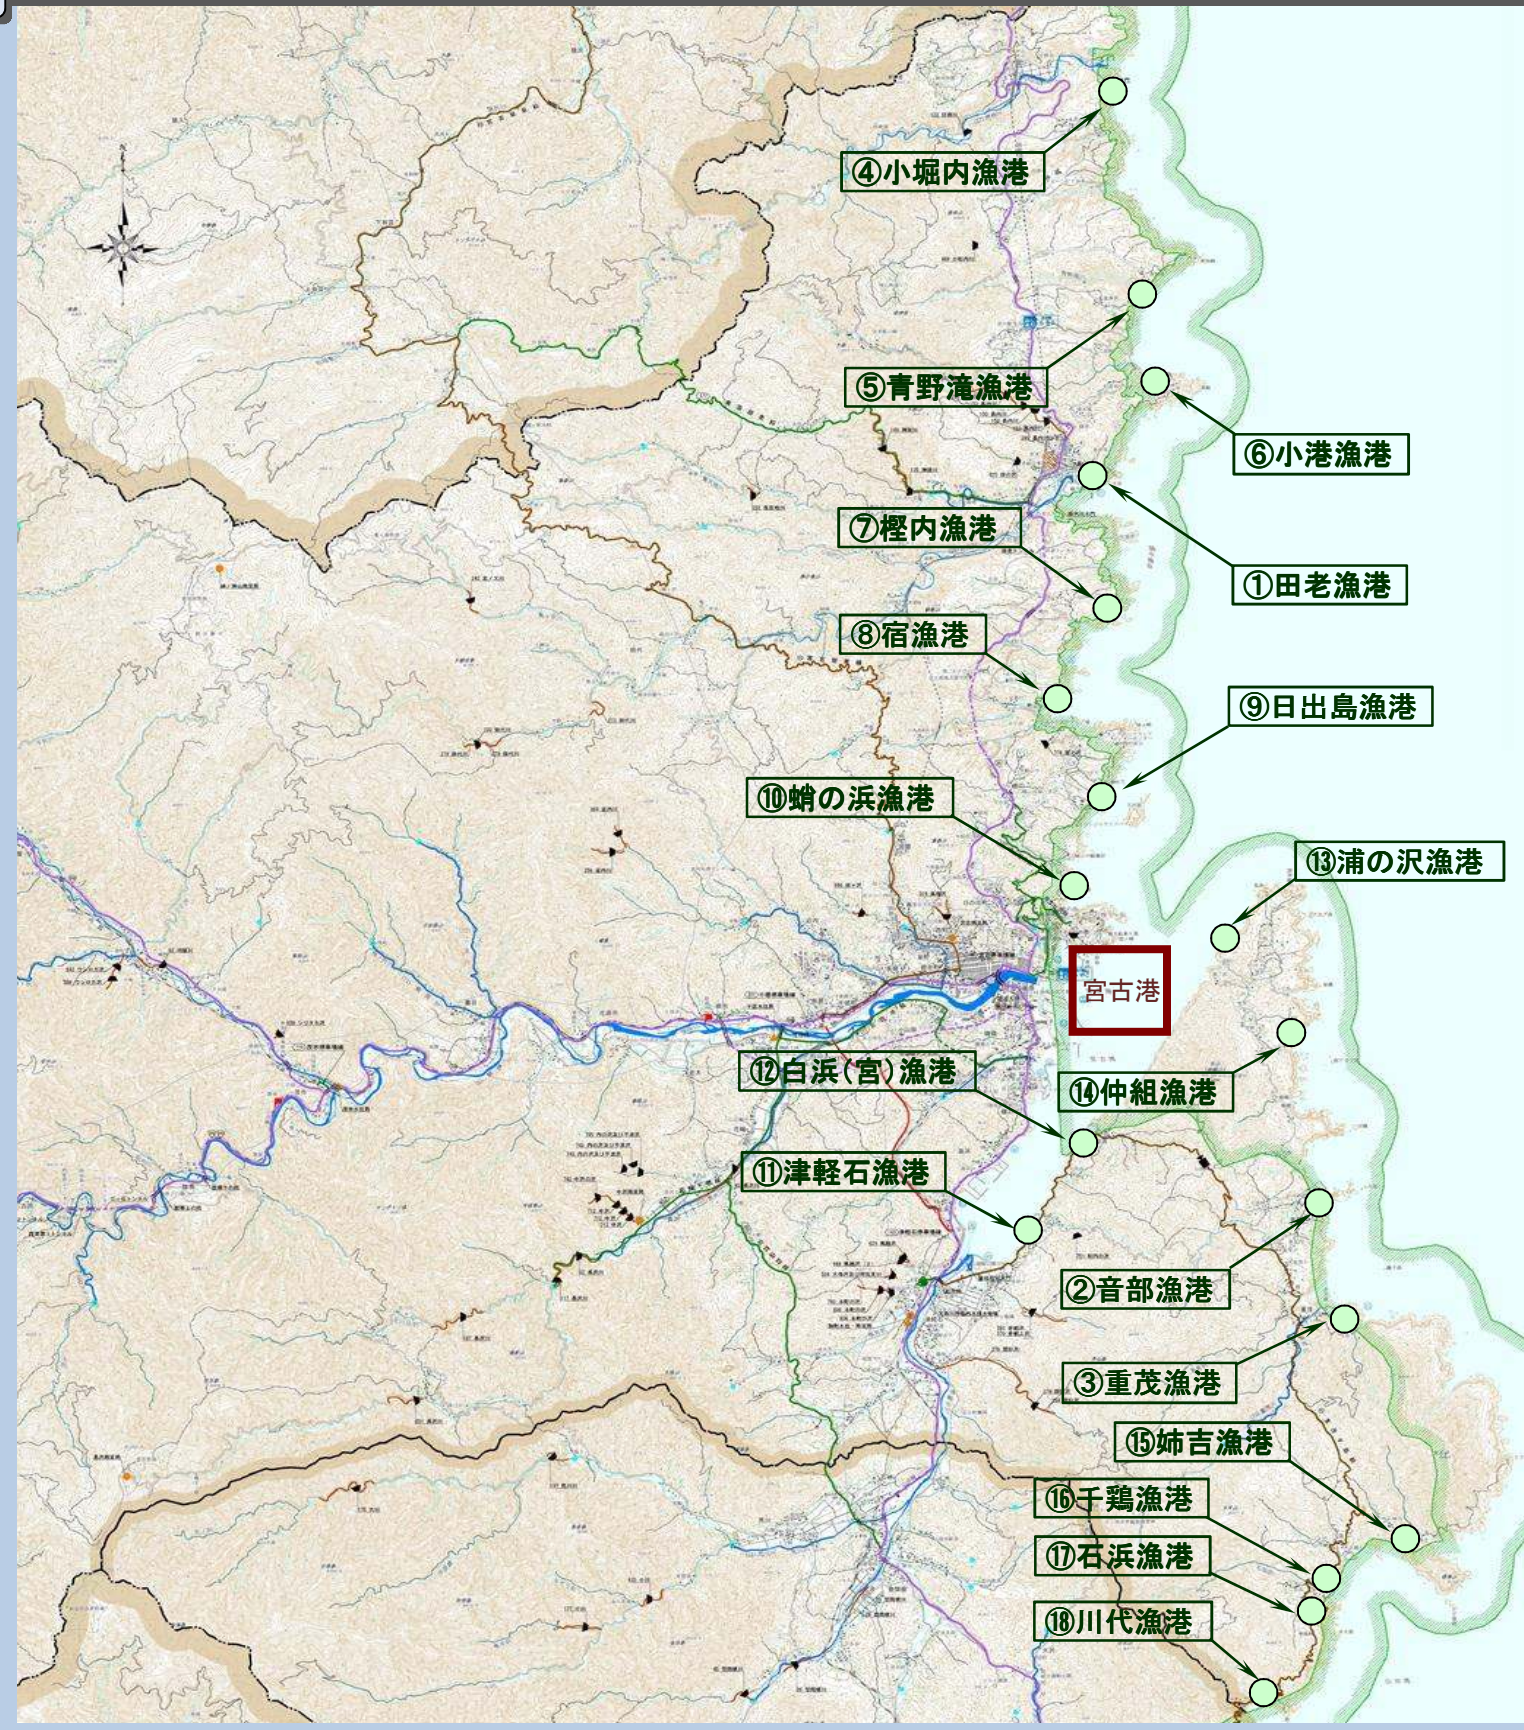


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30	
漁 港	漁 港	県	① 田老漁港	(漁港災害) 防波堤L=689m、 岸壁L=1,133m 他						■H27.9完成						
			② 音部漁港	(漁港災害) 防波堤L=352m、 岸壁L=206m 他				■H26.12完成								
			③ 重茂漁港	(漁港災害) 防波堤L=373m、 岸壁L=663m 他				■H26.12完成								
		市	④ 小堀内漁港	(漁港災害) 防波堤L=121m、 岸壁L=127m 他					■H27.3完成							
			⑤ 青野滝漁港	(漁港災害) 防波堤L=46m 他	■H25.10完成											
			⑥ 小港漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m 他						■H28.3完成						
			⑦ 桎内漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、 岸壁L=52m 他	■H25.10完成											
			⑧ 宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=85m、 岸壁L=215m 他						★工事						
			⑨ 日出島漁港	(漁港災害) 防波堤L=526m、 岸壁L=320m 他						★工事						
			⑩ 蛸の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=260m 他						★工事						
			⑪ 津軽石漁港	(漁港災害) 防波堤L=196m、 岸壁L=50m 他					■H26.12完成							
			⑫ 白浜(宮)漁港	(漁港災害) 防波堤L=110m、 岸壁L=200m 他					■H27.3完成							
			⑬ 浦の沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=139m、 岸壁L=101m 他	用地、設計等					★工事						
			⑭ 仲組漁港	(漁港災害) 防波堤L=157m、 岸壁L=145m 他					■H26.12完成							
			⑮ 姉吉漁港	(漁港災害) 防波堤L=86m、 岸壁L=40m 他	用地、設計等					★工事						
			⑯ 千鷲漁港	(漁港災害) 防波堤L=428m、 岸壁L=260m 他						■H28.3完成						
			⑰ 石浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=345m、 岸壁L=100m 他	■H26.1完成											
			⑱ 川代漁港	(漁港災害) 防波堤L=73m、 岸壁L=45m 他					■H27.3完成							
港 湾	宮古港	国	竜神崎防波堤	(防波堤整備・直轄災害復旧)防波堤L=400m	★工事(平成29年度完成予定)											
		県	出崎地区	(災害復旧) 出崎防波堤(2)L=20m						■H28.3完成						
			鎌ヶ崎地区	(災害復旧) 開伊川 -1.5m物揚場L=295m、 -3.0m物揚場L=728m	用地、設計等						★工事					
			日立浜地区	(災害復旧) -4.5m岸壁L=240m、 -2.0m物揚場L=101m、 船揚場(1)L=228m、 船揚場(2)L=84m						★工事						
			高浜地区	(災害復旧) 防波堤(北)L=250.2m、 防波堤(南)L=200m、 -2.0m物揚場(1)、 (2)L=200m他					■H27.3完成							
			藤原地区	(災害復旧) 船揚場L=50m、埠頭保安 設備L=1,250m						■H28.3完成						
			神林地区	(災害復旧) 南防波堤L=112m、 防波堤L=31m、-2.0m物 揚場L=181m 他						★工事						
			浄土ヶ浜地区	(災害復旧) 防波堤L=89m、 -2.0m物揚場L=44m、 さん橋L=70m	■H25.7完成											

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町1/3】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

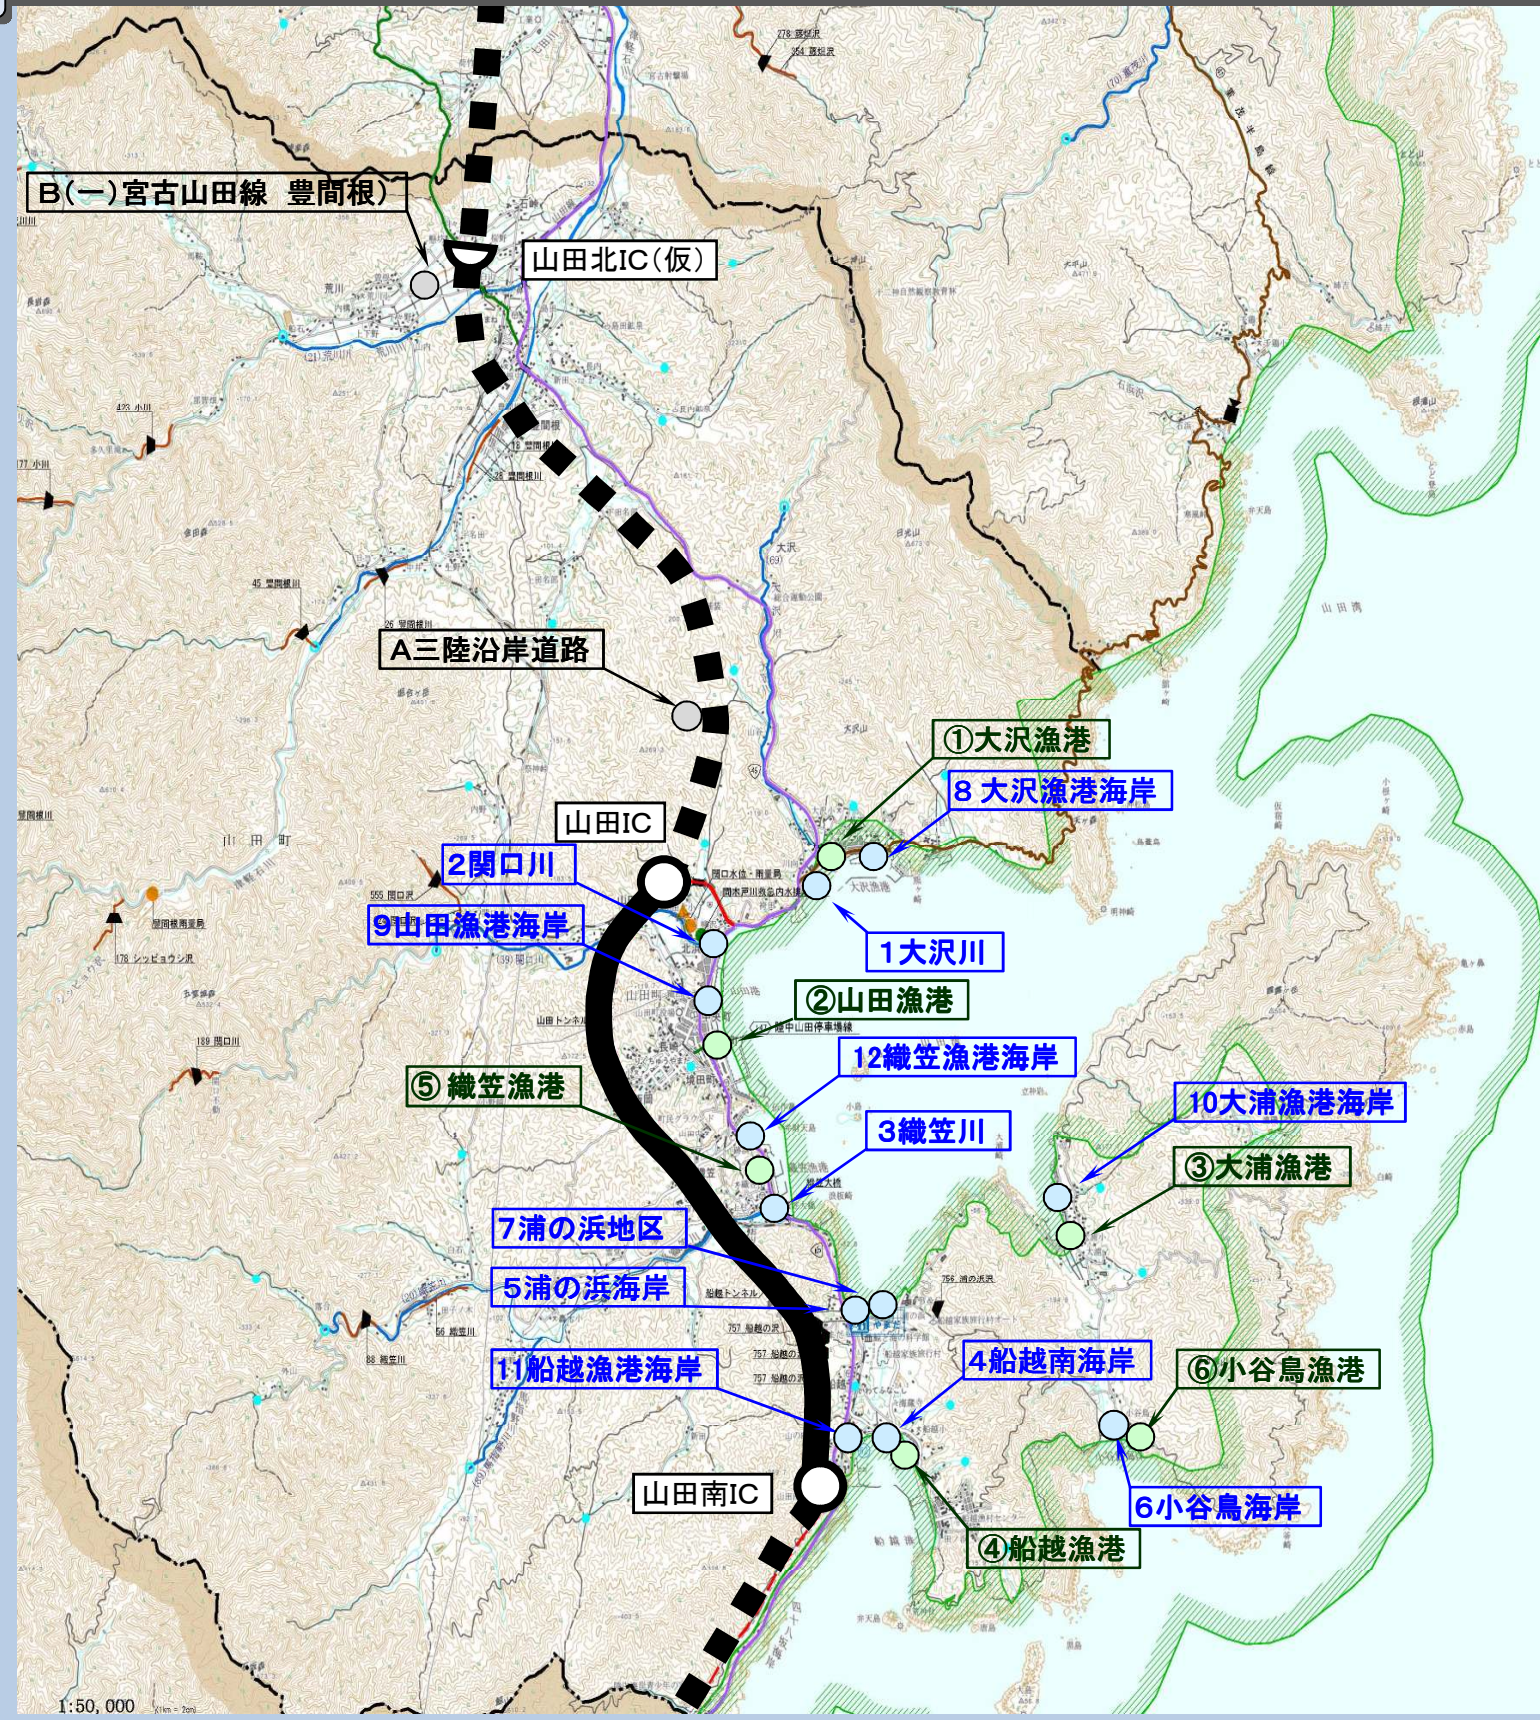


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等			★工事						
			2 関口川	(三陸高潮) 水門N=1基	★工事									
			3 織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基	★工事									
			4 船越南海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等			★工事						
	農地海岸		5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基	★工事									
			6 小谷鳥海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基	★工事									
	林野海岸		7 浦の浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	■H25.3完成									
	漁港海岸		8-1 大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、 水門N=9基 他	用地、設計等			★工事						
			8-2 大沢 (熊ヶ崎地区他)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等			★工事						
			9-1 山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、 水門N=1基 他	用地、設計等			★工事						
			9-2 山田 (柳沢地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km	用地、設計等			★工事						
			10 大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km、 水門N=6基 他	用地、設計等			★工事						
			11 船越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、 水門N=6基 他	用地、設計等			★工事						
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	山田宮古道路 (山田～宮古南)	★用地買収、工事等 ◆H25.6.17起工式									
				釜石山田道路	★用地買収、工事等 ※釜石JCT～釜石両石IC、大槌IC～山田南IC H30開通予定									
復興道路等	復興支援道路	県	B (一) 宮古山田線	豊間根	★工事 ◆H27.3着工									
	漁港	県	① 大沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,360m、 岸壁L=1,417m 他	■H27.3完成			★工事						
② 山田漁港			(漁港災害) 防波堤L=913m、 岸壁L=2,376m 他	★工事										
③ 大浦漁港			(漁港災害) 防波堤L=424m、 岸壁L=1,286m 他	■H28.3完成			★工事							
④ 船越漁港			(漁港災害) 防波堤L=1,398m、 岸壁L=2,346m 他	★工事										
町		⑤ 織笠漁港	(漁港災害) 防波堤L=628m、 岸壁L=675m 他	■H28.3完成			★工事							
		⑥ 小谷鳥漁港	(漁港災害) 防波堤L=348m、 岸壁L=176m 他	★工事										

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町2/3】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

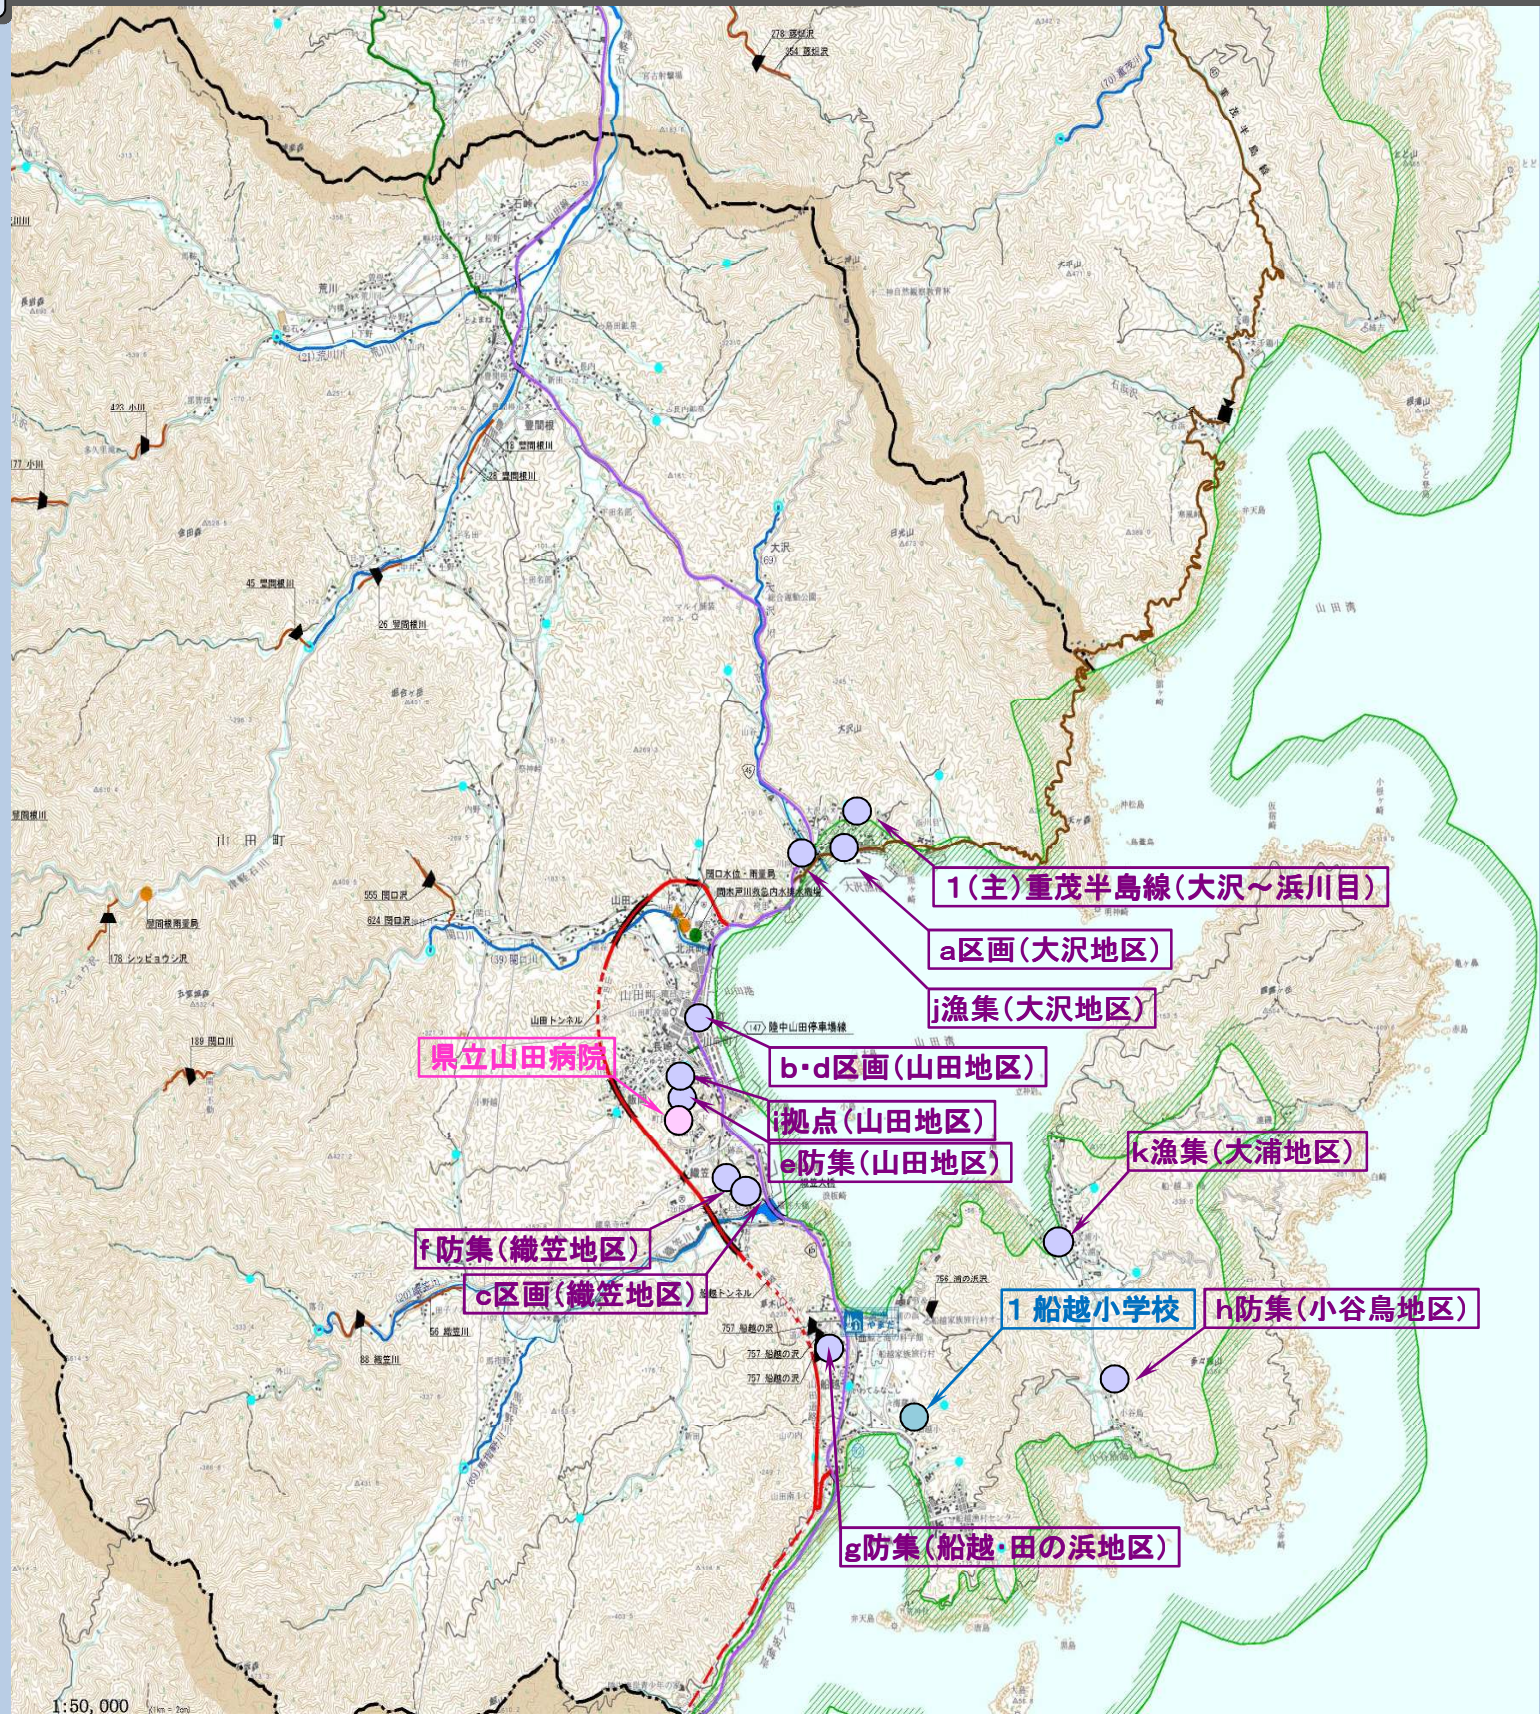


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 （基盤復興期間）		第2期 （本格復興期間）				第3期 （更なる展開への連結期間）			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	土地区画整理	町	a 大沢地区	区域面積：6.5ha 対象戸数：139戸 （民139戸）	用地、設計等				★工事					
			b 山田地区	区域面積：20.3ha 対象戸数：621戸 （民475戸・公146戸）	用地、設計等				★工事					
			c 織笠地区	区域面積：2.5ha 対象戸数：47戸 （民47戸）	用地、設計等				★工事					
			d 山田 国道45号周辺地区	区域面積：20.0ha	用地、設計等				★工事					
	防災集団移転	町	e 山田地区	対象戸数：162戸 （民104戸・公58戸）	用地、設計等				★工事					
			f 織笠地区	対象戸数：170戸 （民148戸・公22戸）	用地、設計等				★工事					
			g 船越・ 田の浜地区	対象戸数：223戸 （民144戸・公79戸）	用地、設計等				★工事					
			h 小谷島地区	対象戸数：4戸 （民4戸）	用地、設計等				★工事					
	津波復興拠点	町	i 山田地区	(中心市街地エリア) 区域面積：3.1ha	用地、設計等				★工事					
				(公共防災エリア) 区域面積：3.9ha	用地、設計等				★工事					
	漁業集落防災 機能強化	町	j 大沢地区	対象戸数：156戸 （民136戸・公20戸）	用地、設計等				★工事					
			k 大浦地区	対象戸数：8戸 （民8戸）	用地、設計等				★工事					
医療	病院	県	1 (主)重茂半島線	大沢～浜川目	用地、設計等				★工事					
					用地、設計等				★工事					
					用地、設計等				★工事					
教育	小学校	町	1 船越小学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等				★工事					
					用地、設計等				★工事					

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町3/3】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

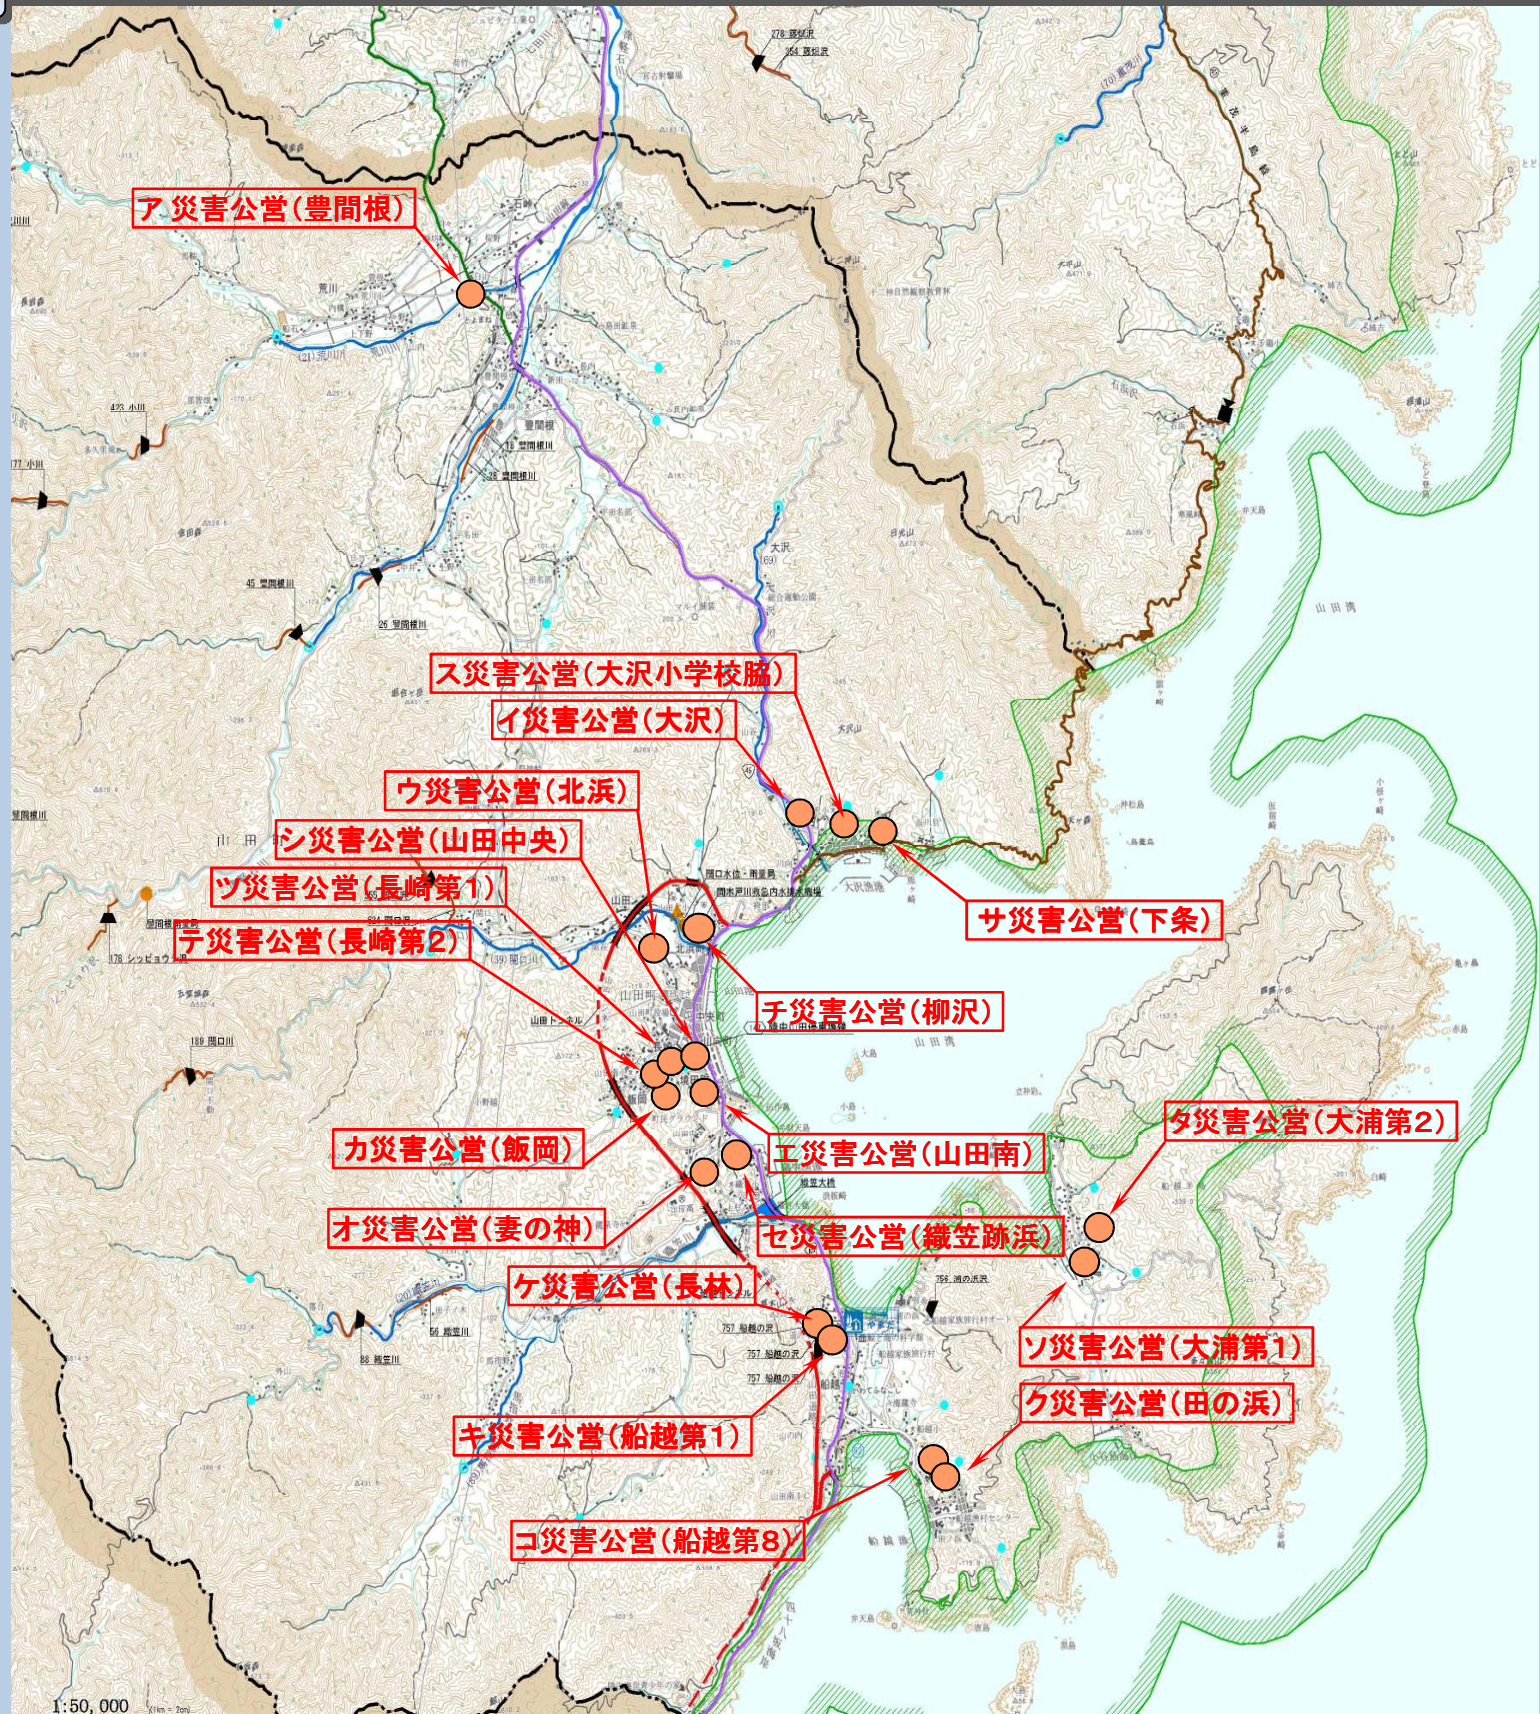

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 （基盤復興期間）			第2期 （本格復興期間）				第3期 （更なる展開への連結期間）		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
災害公営住宅	直接建設	県	ア 豊間根（単独）	S造3階 戸数：72戸				72戸	■H26.6完成					
			イ 大沢（単独）	RC造5階 戸数：35戸					35戸	■H28.3完成				
			ウ 北浜（単独）	RC造4階 戸数：72戸				用地、設計等		★工事				
			エ 山田南（単独）	RC造 戸数：48戸						用地、設計等				48戸
			オ 妻の神（単独）	RC造4階 戸数：52戸					52戸	■H27.10完成				
	直接建設	町（県建設分）	カ 飯岡（防：山田地区）	戸数：58戸						用地、設計等				58戸
			キ 船越第1（防：船越・田の浜地区）	RC造3階 戸数：21戸						用地、設計等				21戸
			ク 田の浜（防：船越・田の浜地区）	RC造3階 戸数：21戸						用地、設計等				21戸
			ケ 長林（防：船越・田の浜地区）	戸数：22戸						用地、設計等				22戸
			コ 船越第8（防：船越・田の浜地区）	戸数：15戸						用地、設計等				15戸
	買取	町	サ 下条団地（単独）	戸数：20戸						用地、設計等				20戸
			シ 山田中央（区：山田地区）	RC造6階 戸数：146戸						用地、設計等				146戸
			ス 大沢小学校脇（漁：大沢地区）	戸数：20戸						用地、設計等				20戸
			セ 織笠跡浜（防：織笠地区）	S造 戸数：22戸					22戸	■H27.11完成				
			ソ 大浦第1（単独）	木造 戸数：9戸						9戸	■H28.3完成			
			タ 大浦第2（単独）	木造 戸数：16戸						用地、設計等				16戸
			チ 柳沢（改修）（単独）	RC造 戸数：49戸						49戸	■H27.4完成			
			ツ 長崎第1-1	RC造 戸数：21戸						用地、設計等				21戸
			ツ 長崎第1-2	木造 戸数：8戸						用地、設計等				8戸
			テ 長崎第2-1	RC造 戸数：42戸						用地、設計等				42戸
			テ 長崎第2-2	木造 戸数：8戸						用地、設計等				8戸

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町1/3】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 （基盤復興期間）			第2期 （本格復興期間）				第3期 （更なる展開への連結期間）		
					H23	H24	H25	H26		H27	H28		H29	H30
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大槌川	（災害復旧） 防潮堤L=0.4km、 水門等N=1基	用地、設計等		★工事 H31完成予定							
			2 小槌川	（災害復旧） 防潮堤L=0.2km、 水門等N=1基	用地、設計等		★工事 H31完成予定							
	林野海岸		3 浪板地区	（治山施設災害） 防潮堤L=0.4km	■H24.10完成									
	漁港海岸		4 吉里吉里 漁港海岸	（災害復旧） 防潮堤L=0.7km、 水門N=4基 他	用地、設計等		★工事							
			5 大槌漁港海岸	（災害復旧） 防潮堤L=2.7km、 水門N=3基 他	用地、設計等		★工事							
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	釜石山田道路	★用地買収、工事等 ※釜石JCT～釜石両石IC、大槌IC～山田南IC H30開通予定									
	復興関連道路	県	B（主） 大槌小国線	土坂の3	★工事									
漁 港	漁 港	県	① 吉里吉里漁港	（漁港災害） 防波堤L=596m、 岸壁L=753m 他	■H28.3完成									
			② 大槌漁港	（漁港災害） 防波堤L=1,486m、 岸壁L=2,582m 他	■H28.3完成									
医 療	病院	県	県立大槌病院	病院（RC造） 医師公舎（RC造） 職員公舎（RC造）	■H28.3完成									
教 育	小学校	町	大槌小学校 安渡小学校 赤浜小学校 大槌北小学校	（災害復旧） 移転	用地、設計等		H25 小学校4校統合（新校名：大槌小学校） 移転完了まで仮設校舎を使用。							
	中学校		大槌中学校	（災害復旧） 移転	用地、設計等		移転完了まで仮設校舎を使用。							
復興 まちづくり	まちづくり 連携道路	県	1（一）吉里吉里 釜石線	赤浜	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基金復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	土地区画整理		a 町方地区	区域面積: 29.6ha 対象戸数: 825戸 (民510戸・公315戸)	用地、設計等			★工事			民95戸・公53戸	民325戸・公12戸	民90戸・公32戸	公218戸
			b 安渡地区	区域面積: 6.0ha 対象戸数: 190戸 (民110戸・公80戸)	用地、設計等			★工事			民49戸・公13戸	民61戸・公58戸	公9戸	
			c 赤浜地区	区域面積: 7.7ha 対象戸数: 150戸 (民150戸)	用地、設計等			★工事			民57戸	民93戸		
			d 吉里吉里地区	区域面積: 9.1ha 対象戸数: 212戸 (民184戸・公28戸)	用地、設計等			★工事			民23戸	民133戸・公18戸	民23戸・公10戸	
	津波復興拠点		e 町方地区	区域面積 町方地区 (4.4ha)	用地、設計等	★工事								
			f 安渡地区	区域面積 安渡地区 (19.6ha)	用地、設計等	★工事								
			g 赤浜地区 (赤浜①団地)	対象戸数: 29戸 (民18戸・公11戸)	用地、設計等	★工事			民18戸		公11戸			
			h 赤浜地区 (赤浜②団地)	対象戸数: 33戸 (民23戸・公10戸)	用地、設計等	★工事			民23戸・公10戸					
	防災集団移転		i 赤浜地区 (赤浜⑥団地)	対象戸数: 35戸 (民13戸・公22戸)	用地、設計等	★工事			民13戸・公22戸					
			j 吉里吉里地区 (吉里吉里①団地)	対象戸数: 18戸 (民18戸)	民2戸	■H27.7完成			民16戸					
			k 吉里吉里地区 (吉里吉里②団地)	対象戸数: 35戸 (民35戸)	用地、設計等	★工事			民35戸					
			l 吉里吉里地区 (吉里吉里③団地)	対象戸数: 13戸 (民13戸)		■H28.3完成			民13戸					
			m 浪板地区 (浪板①団地)	対象戸数: 11戸 (民11戸)		■H27.6完成			民11戸					
			n 安渡地区	対象戸数: 4戸 (民4戸)	用地、設計等	★工事			民4戸					
			o 安渡地区 (安渡①団地)	対象戸数: 27戸 (民27戸)	用地、設計等	★工事			民27戸					
			p 安渡地区 (安渡②団地)	対象戸数: 13戸 (民13戸)	用地、設計等	★工事			民13戸					
			q 安渡地区 (安渡③団地)	対象戸数: 10戸 (民10戸)	用地、設計等	★工事			民10戸					
			r 安渡地区 (安渡④団地)	対象戸数: 19戸 (民19戸)	用地、設計等	★工事			民19戸					
			s 町方・小枕・ 伸松地区 (寺野臼澤団地)	対象戸数: 141戸 (民100戸・公41戸)	用地、設計等	民42戸	民24戸・公16戸	公11戸	民34戸・公14戸					
			t 町方・小枕・ 伸松地区 (大ヶ口、沢山、喜木、 桙内、屋敷前団地)	対象戸数: 65戸 (民65戸)	用地、設計等	民4戸	民37戸	民24戸						
			u 町方・小枕・ 伸松地区 (町方団地)	対象戸数: 35戸 (民35戸)	用地、設計等	民7戸	民3戸	民25戸						
			v 町方・小枕・ 伸松地区 (小枕団地)	対象戸数: 24戸 (民24戸)	用地、設計等	民10戸	★工事							
	w 町方・小枕・ 伸松地区 (花輪田地区)	対象戸数: 10戸 (民10戸)	■H27.1完成											
	漁業集落防災 機能強化		z 吉里吉里地区	漁業集落排水施設	用地、設計等	★工事								
			aa 浪板地区	対象戸数: 21戸 (民10戸・公11戸)	用地、設計等	★工事			民10戸・公11戸					
			ab 安渡地区	集落道他	用地、設計等	工事								
			ac 赤浜地区	対象戸数: 2戸 (民2戸)	用地、設計等、工事	★工事			民2戸					

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町3/3】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基準復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連絡期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
災害公営住宅	直接建設	県	ア 吉里吉里(単独)	RC造5階 戸数: 34戸	■H25.8完成									
			イ 大槌(桎内)(単独)	木造 戸数: 24戸					■H28.3完成	24戸				
			ウ 大槌(屋敷前)(単独)	RC造5階 戸数: 151戸					■H27.10完成	151戸				
			エ 安渡(○)(区: 安渡地区)	RC造5階 戸数: 34戸					用地、設計等・工事				34戸	
			オ 三枚堂(単独)	木造 戸数: 104戸					用地、設計等・工事	104戸			工事	
			カ 町方1(戸建)(区: 町方地区)	木造 戸数: 32戸					用地、設計等・工事				工事	32戸
	買収		カ 町方1(共同)(区: 町方地区)	RC造5階 戸数: 25戸					用地、設計等・工事				工事	25戸
	直接建設		キ 町方2(戸建)(区: 町方地区)	木造 戸数: 56戸					用地、設計等・工事				工事	56戸
	買収		キ 町方2(共同)(区: 町方地区)	RC造5階 戸数: 23戸					用地、設計等・工事				工事	23戸
	直接建設		ク 大ケロ(単独)	木造 戸数: 70戸	■H25.8完成									
			ケ 屋敷前(単独)	木造 戸数: 21戸	■H25.11完成									
			コ 大ケロ2丁目(単独)	木造2階 戸数: 23戸				■H26.9完成	23戸					
			サ 桎内①(単独)	木造 戸数: 13戸				■H26.12完成	13戸					
			シ 町方(末広町)(区: 町方地区)	RC造6階 戸数: 53戸					■H28.3完成	53戸				
災害公営住宅	買収	町	ス 町方(本町)(区: 町方地区)	木造 戸数: 8戸					用地、設計等				8戸	
			セ 町方(御社地)(区: 町方地区)	RC造4戸					用地、設計等				24戸	
			ソ 町方(上町)(区: 町方地区)	木造 戸数: 4戸					用地、設計等				4戸	
			タ 町方1(区: 町方地区)	木造 戸数: 8戸					用地、設計等				8戸	
			チ 町方2(区: 町方地区)	木造 戸数: 82戸					用地、設計等				82戸	
			ツ 吉里吉里(A)(区: 吉里吉里地区)	木造 戸数: 5戸					用地、設計等				5戸	
			テ 吉里吉里(B1)(区: 吉里吉里地区)	木造 戸数: 13戸					用地、設計等				13戸	
			ト 吉里吉里(B2)(区: 吉里吉里地区)	木造 戸数: 6戸					用地、設計等				6戸	
			ナ 吉里吉里(C)(区: 吉里吉里地区)	木造 戸数: 4戸					用地、設計等				4戸	
			ニ 赤浜①団地(防: 赤浜地区)	木造 戸数: 11戸					用地、設計等				11戸	
			ヌ 赤浜②団地(防: 赤浜地区)	木造 戸数: 10戸					用地、設計等				10戸	
			ホ 赤浜⑥団地(防: 赤浜地区)	木造 戸数: 22戸					用地、設計等				22戸	
			ノ 浪板(漁: 浪板地区)	木造 戸数: 11戸					用地、設計等				11戸	
			ハ 浪板(1)(単独)	木造 戸数: 3戸					用地、設計等				3戸	
			ヒ 浪板(2)(単独)	木造 戸数: 1戸					用地、設計等				1戸	
			フ 安渡(A)(区: 安渡地区)	木造 戸数: 10戸					用地、設計等				10戸	
			ヘ 安渡(A)(区: 安渡地区)	木造 戸数: 14戸					用地、設計等				14戸	
			ホ 安渡(B1)(区: 安渡地区)	木造 戸数: 13戸					用地、設計等				13戸	
			マ 安渡(B2)(区: 安渡地区)	木造 戸数: 9戸					用地、設計等				9戸	
			ミ 寺野1(防: 寺野地区)	木造 戸数: 16戸					■H27.9完成	16戸				
			ム 寺野2(防: 寺野地区)	木造 戸数: 11戸					用地、設計等				11戸	
			メ 寺野3(防: 寺野地区)	木造 戸数: 14戸					用地、設計等				14戸	

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

The map illustrates the following infrastructure elements:


- Main Route:** A thick black dashed line running from the north (Kanao Bay) towards the south.
- Interchanges (IC) and Junctions (JCT):** Marked with white circles and labeled in black boxes:
 - D(主)釜石遠野線 剣
 - 釜石北IC
 - 釜石両石IC
 - 釜石中央IC(仮)
 - 釜石JCT(仮)
 - 釜石南IC(仮)
 - 釜石唐丹IC(仮)
 - 大槌IC(仮)
- Roads and Sections:** Labeled in black boxes:
 - A三陸沿岸道路
 - B東北横断自動車道 釜石秋田線
 - C(一)水海大渡線 女遊部
 - E(一)桜峠平田線 平田
 - F(一)吉浜上荒川線 下荒川
- Coastal Areas and Points of Interest:** Indicated by numbered blue boxes:
 - 3片岸海岸
 - 2鶴住居川
 - 9根浜地区
 - 12両石漁港海岸
 - 4水海海岸
 - 6釜石港海岸
 - 18塘石漁港海岸
 - 8下荒川海岸
 - 7本郷海岸
 - 14小白浜漁港海岸
 - 5小白浜海岸
 - 15浜漁港海岸
 - 10箱崎漁港海岸
 - 11白浜(鶴)漁港海岸
 - 16飯宿漁港海岸
 - 17桑の浜漁港海岸
 - 13釜石漁港海岸
 - 1甲子川
 - 19平田漁港海岸
 - 20白浜(釜)漁港海岸
 - 21佐須漁港海岸
- Geographical Features:** The map shows surrounding mountains like 仙磐山, 松倉山, 鷹巣山, and 物見山, as well as rivers such as 荒川 and 釜石川. Topographic contour lines are also visible.

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 甲子川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等	★工事									
			2 鶴住居川	(災害復旧) 水門等N=1基	用地、設計等	★工事									
			3 片岸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km	用地、設計等	★工事									
			4 水海海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基、 離岸堤L=280m		■H28.3完成									
			5 小白浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門等N=2基	用地、設計	★工事									
			6 釜石港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.1km、 水門等N=19基		★工事									
	農地海岸	県	7 本郷海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基		★工事									
			8 下荒川海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基	用地、設計等	★工事									
	林野海岸	9 根浜地区	(治山施設災害復旧) 防潮堤L=0.6km		■H28.3完成										
	漁港海岸	市	10 箱崎漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	用地、設計等	★工事									
			11 白浜(鶴) 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=3基 他	用地、設計等	★工事									
			12 両石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=1基 他	用地、設計等	★工事									
			13 釜石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.8km、 水門N=6基 他	用地、設計等	★工事									
			14 小白浜 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=1基 他	用地、設計等	★工事									
			15 室浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	用地、設計等	★工事									
			16 仮宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km	用地、設計等	★工事									
			17 桑の浜 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	用地、設計等	★工事									
			18 蟠石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	用地、設計等	★工事									
			19 平田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=1基 他	用地、設計等	★工事									
			20 白浜(釜石) 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	用地、設計等	工事									
			21 佐須漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	用地、設計等	★工事									
復興道路等			復興道路	国	A 三陸沿岸道路	釜石山田道路	★用地買収、工事等 ※釜石JCT～釜石両石IC、大槌IC～山田南IC H30開通予定								
	吉浜釜石道路 (吉浜～釜石)	★用地買収、工事等 ◆H25.2.25起工事													
	B 東北横断自動車道 釜石秋田線	釜石道路 (釜石～釜石西)			★用地買収、工事等 ◆H24.11.4起工事										
	復興支援道路	県	C (一) 水海大渡線	女遊部	■H24.3.5供用開始										
			D (主) 釜石遠野線	剣	◆H25.9着工 ★工事										
			E (一) 桜峠平田線	平田	◆H25.10着工 ★工事										
F (一) 吉浜上荒川線			下荒川	■H28.3.22供用開始											

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市3/5】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

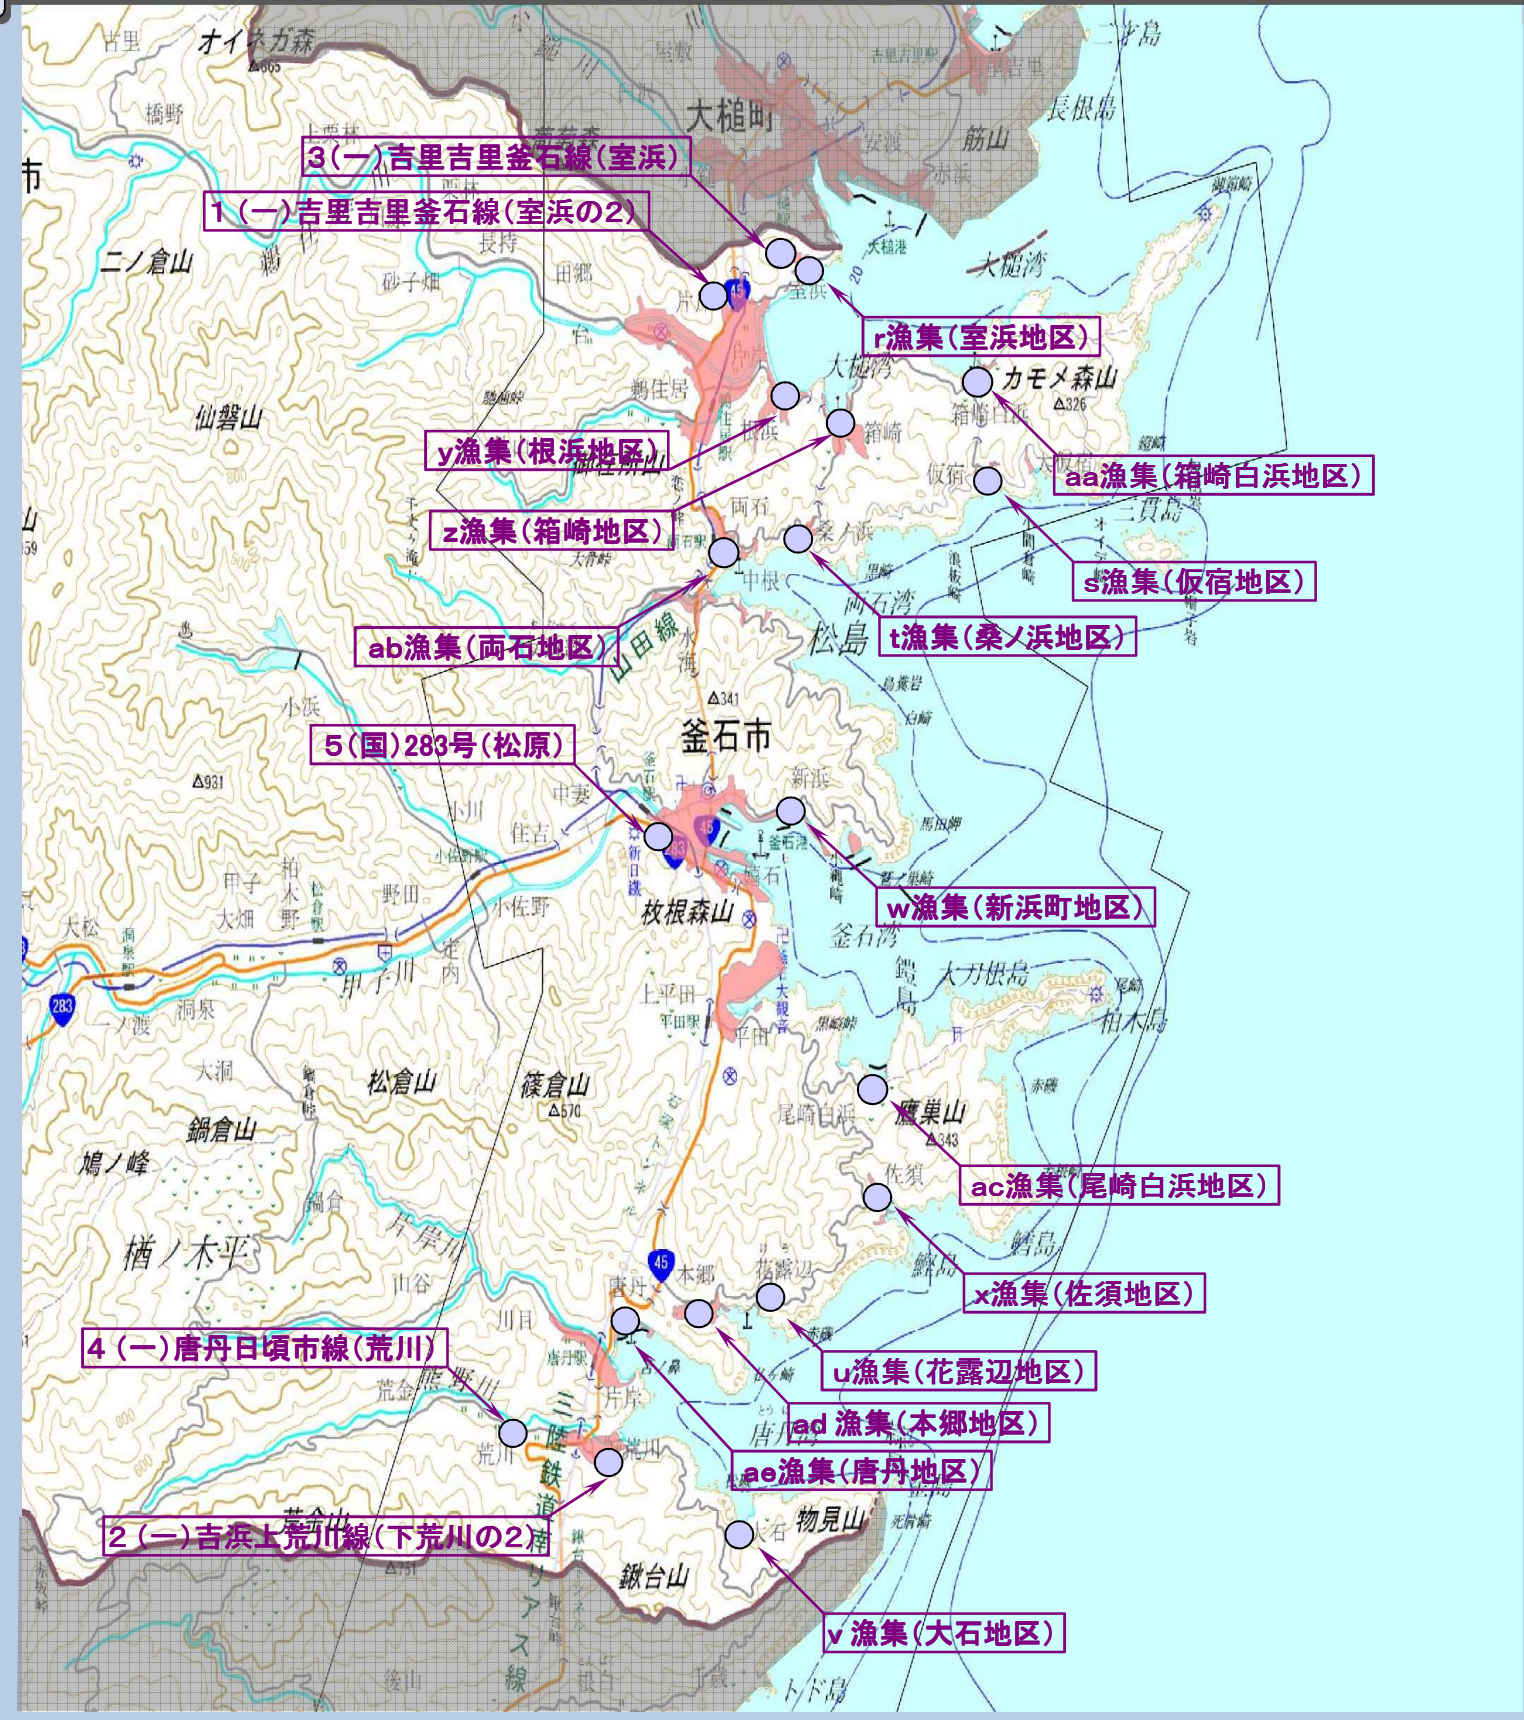

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	漁業集落防災 機能強化	市	r 室浜地区	対象戸数:16戸 (民11戸・公5戸)					■H27.10完成					
			s 仮宿地区	対象戸数2戸 (民2戸)					■H28.3完成					
			t 桑ノ浜地区	対象戸数:7戸 (民4戸・公3戸)	用地、設計等			★工事						
			u 花露辺地区	集落道 他					■H28.2完成					
			v 大石地区	集落道 他			用地、設計等			工事				
			w 新浜町地区	用地造成他			用地、設計等			工事				
			x 佐須地区	対象戸数:5戸 (民5戸)				■H27.6完成						
			y 根浜地区	対象戸数:6戸 (民4戸・公2戸)	用地、設計等			★工事						
			z 箱崎地区	対象戸数:35戸 (民18戸・公17戸)					■H28.3完成					
			aa 箱崎白浜地区	対象戸数:3戸 (民3戸)					■H28.3完成					
			ab 両石地区	対象戸数:55戸 (民36戸・公19戸)			用地、設計等	★工事						
			ac 尾崎白浜地区	対象戸数:2戸 (民2戸)					■H27.9完成					
			ad 本郷地区	対象戸数7戸 (民2戸・公5戸)					■H27.9完成					
			ae 唐丹地区	集落排水施設整備 L=3,353m 処理施設整備1式			用地、設計等		★工事					
まちづくり 連携道路	県		1 (一) 吉里吉里釜石線	室浜の2				◆H26.10着工	★工事					
			2 (一) 吉浜上荒川線	下荒川の2					■H27.11.4供用開始					
			3 (一) 吉里吉里釜石線	室浜				◆H26.9着工	★工事					
			4 (一) 唐丹日頃市線	荒川				◆H26.12着工	★工事					
			5 (国)283号	松原						■H28.3.14供用開始				

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

分区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					第1期 (基準年度期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる復興への連結期間)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
災害公営住宅	直接建設	県	ア 平田 (単独)	RC造7階 戸数:126戸		■H26.1完成																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市5/5】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30	
漁 港	漁 港	県	① 箱崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=624m、 岸壁L=889m 他					■H27.3完成							
			② 白浜(鵜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=505m、 岸壁L=504m 他					■H27.1完成							
			③ 両石漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、 岸壁L=834m 他						■H28.3完成						
			④ 釜石漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,120m、 岸壁L=1,898m 他				★工事								
			⑤ 唐丹漁港	(漁港災害) 防波堤L=623m、 岸壁L=572m 他					■H27.3完成							
			⑥ 小白浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=819m、 岸壁L=834m 他					■H26.12完成							
	市	⑦ 室浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=163m、 岸壁L=190m 他						■H28.3完成							
		⑧ 片岸漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、 岸壁L=135m 他					■H27.3完成								
		⑨ 仮宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=130m、 岸壁L=60m 他					■H27.3完成								
		⑩ 桑ノ浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=209m、 岸壁L=250m 他					■H27.3完成								
		⑪ 嬉石漁港	(漁港災害) 防波堤L=76m、 岸壁L=304m 他		用地、設計等		★工事									
		⑫ 平田漁港	(漁港災害) 防波堤L=215m、 岸壁L=598m 他					■H27.3完成								
		⑬ 白浜(釜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=449m、 岸壁L=378m 他						■H27.10完成							
		⑭ 佐須漁港	(漁港災害) 防波堤L=174m、 岸壁L=103m 他						■H28.3完成							
		⑮ 大石漁港	(漁港災害) 防波堤L=361m、 岸壁L=233m 他						■H27.12完成							
港 湾	釜石港	国 A 湾口防波堤	(直轄災害復旧) 防波堤L=1,660m		★工事(平成29年度完成予定)											
		県 B 須賀地区	(災害復旧) 南防波堤L=266m、 -4.0m1号物揚場 L=200m、 -7.5m岸壁L=152m他							■H28.3完成						
教 育	小学校	市	1 唐丹小学校	(災害復旧) 移転		用地、設計等					4校とも移転完了まで仮設校舎を使用					
								★工事								
	2 鵜住居小学校		(災害復旧) 移転		用地、設計等					★工事						
	3 唐丹中学校		(災害復旧) 現敷地で新築		用地、設計等					★工事						
4 釜石東中学校	(災害復旧) 移転		用地、設計等					★工事								

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市1/5】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

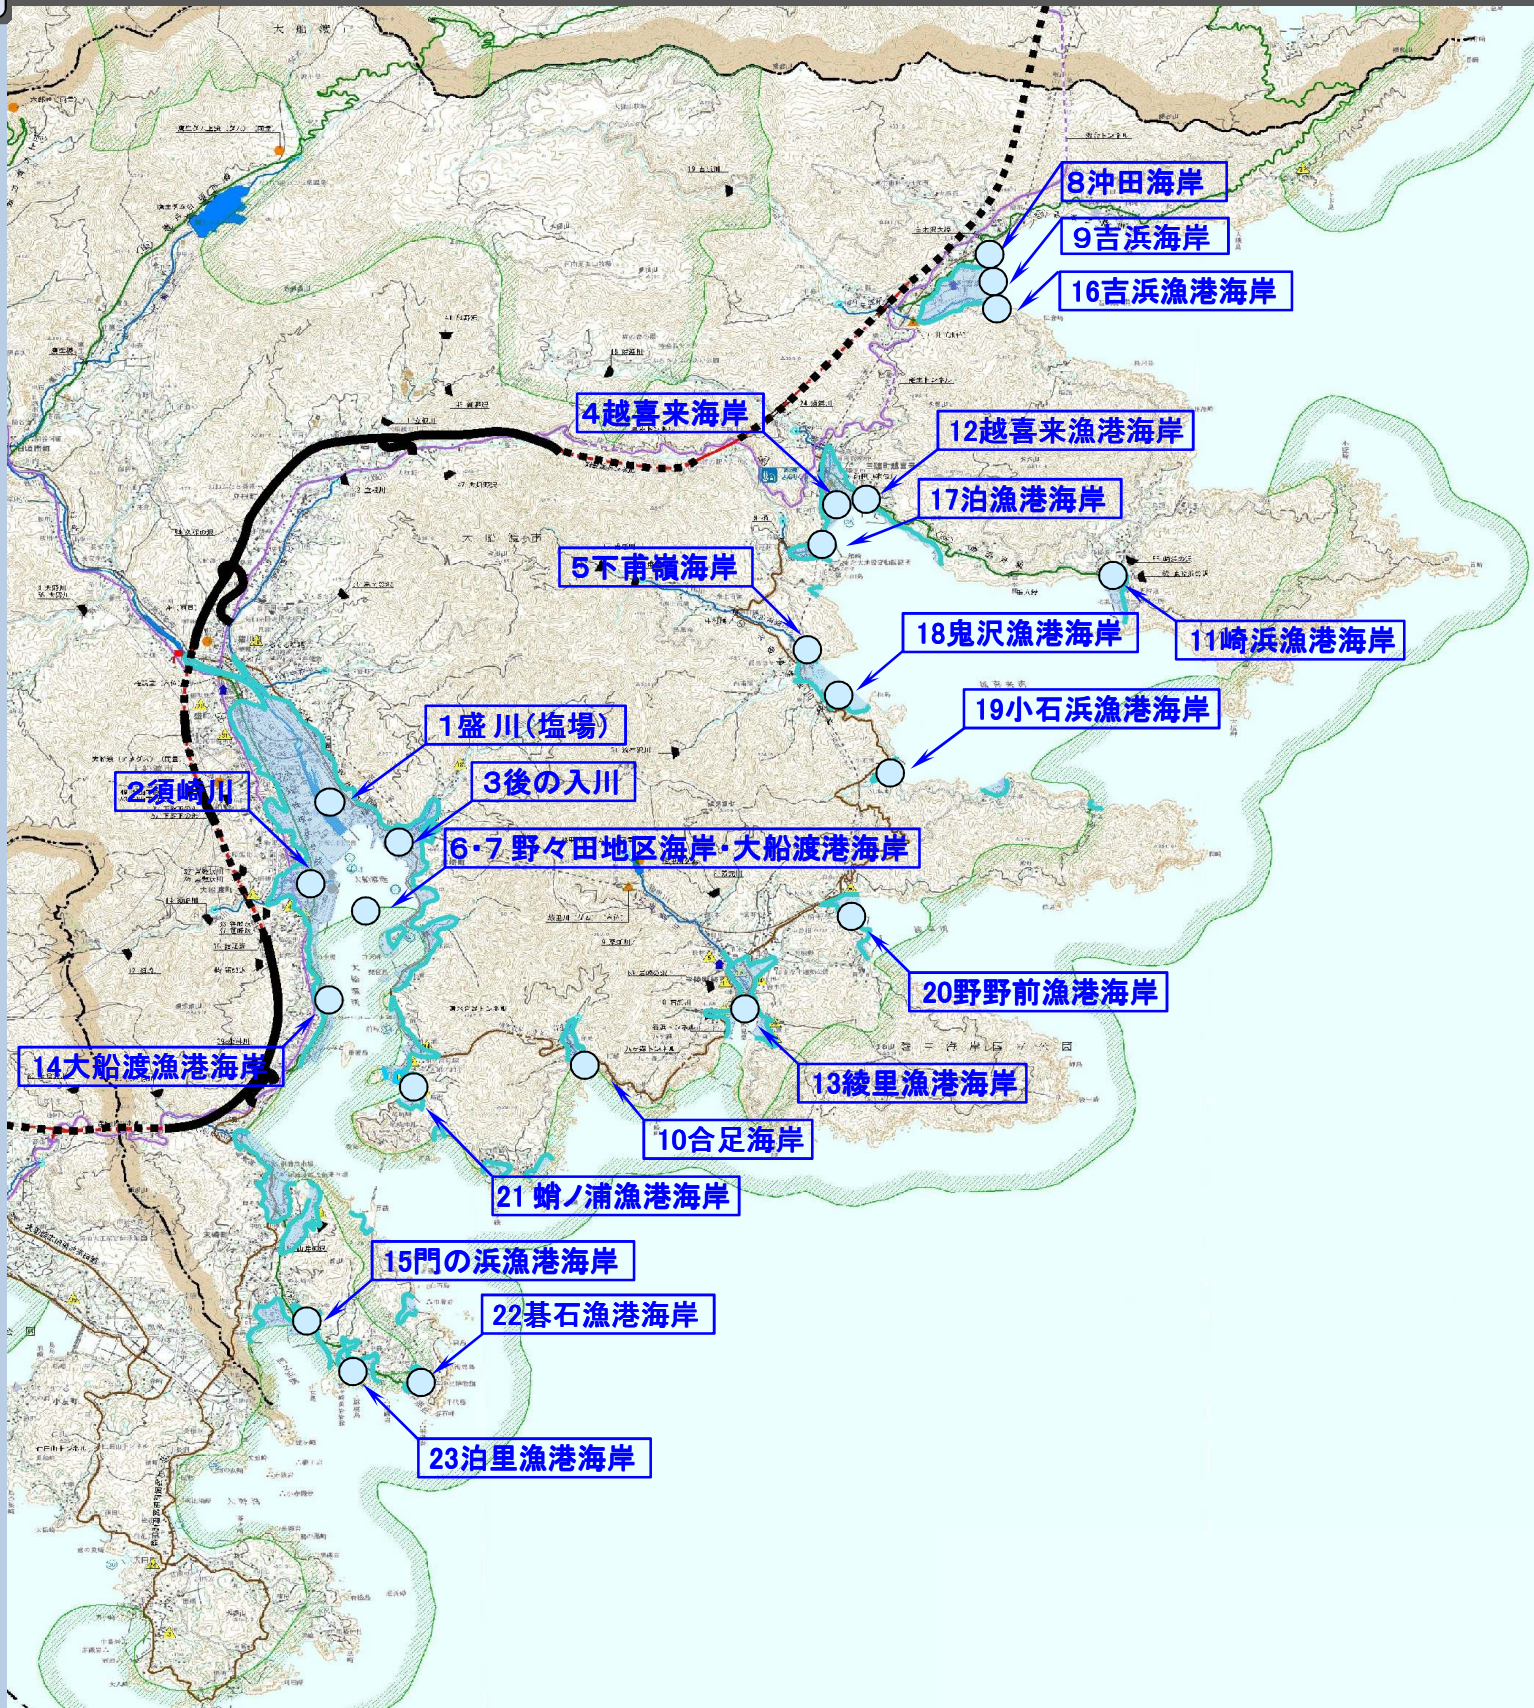

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール																	
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)											
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30							
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 盛川(塩場)	(災害復旧) 防潮堤L=2.3km		★工事																
			2 須崎川	(三陸高潮) 水門N=1基		★工事																
			3 後の入川	(三陸高潮) 水門N=1基															★工事			
			4 越喜来海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、 水門N=2基他		★工事																
			5 下甫嶺海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=2基他		★工事																
			6 野々田 地区海岸	(港湾高潮) 防潮堤L=4.1km															★工事			
			7 大船渡港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.6km、 水門等N=38基															★工事			
	農地海岸		8 沖田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km																		
			9 吉浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km、 水門等N=2基		★工事																
			10 合足海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=2基																		
	漁港海岸		11 崎浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=3基 他															★工事			
			12 越喜来 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基 他		★工事																
			13-1 綾里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 水門N=3基 他															★工事			
			13-2 綾里 (石浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km															★工事			
			14-1 大船渡 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.6km、 水門N=11基 他															★工事			
			14-2 大船渡 (細浦他地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=2.8km、 水門N=1基 他															★工事			
			15 門の浜 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.5km、 水門N=2基 他															★工事			
			市	16 吉浜 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他		★工事															
				17 泊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他		★工事															
				18 鬼沢 漁港海岸	(災害復旧) 海岸護岸L=0.1km																	
				19 小石浜 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=2基 他		★工事															
				20 野野前 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=2基 他		★工事															
				21 蛸ノ浦 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、 水門N=6基 他															★工事		
				22 碁石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=2基 他															★工事		
				23 泊里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基 他															工事		


基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26		H27		H28	H29	H30	
復興まちづくり	土地区画整理	市	a 大船渡駅周辺地区	区域面積: 約33.8ha 対象戸数281戸 (民231戸・公50戸)	用地、設計等					民11戸		民39戸・公50戸		民23戸	民158戸
			★工事												
			b 大船渡地区	対象戸数: 18戸 (民18戸)				■H27.5完成		民18戸					
			c 峰岸地区	対象戸数: 21戸 (民21戸)				■H27.6完成		民21戸					
			d 小河原地区(平林)	対象戸数: 29戸 (民29戸)				■H27.6完成		民29戸					
			e 小河原地区(上山)	対象戸数: 6戸 (民6戸)				■H27.4完成		民6戸					
			f 小河原地区(鶴巻)	対象戸数: 6戸 (民6戸)				■H26.10完成		民6戸					
			g 神坂地区	対象戸数: 9戸 (民9戸)				■H27.3完成		民9戸					
			h 細浦地区	対象戸数: 13戸 (民13戸)				■H27.1完成		民13戸					
			i 小細浦地区	対象戸数: 8戸 (民8戸)	■H25.12完成		民8戸								
			j 梅神地区	対象戸数: 13戸 (民13戸)				■H27.4完成		民3戸		民10戸			
			k 門之浜地区	対象戸数: 13戸 (民13戸)	■H26.3完成		民13戸								
			l 泊里地区	対象戸数: 17戸 (民17戸)				■H27.7完成		民17戸					
			m 佐野地区	対象戸数: 5戸 (民5戸)				■H26.4完成		民5戸					
			n 中赤崎地区	対象戸数: 59戸 (民59戸)	用地、設計等			民5戸		民7戸		民10戸	民37戸		
			★工事												
			o 永浜地区	対象戸数: 28戸 (民28戸)	用地、設計等			民1戸				民27戸			
			★工事												
			p 清水地区	対象戸数: 6戸 (民6戸)				■H26.8完成		民6戸					
			q 蛸ノ浦地区	対象戸数: 16戸 (民16戸)						■H27.10完成		民16戸			
	r 田浜地区	対象戸数: 12戸 (民12戸)				■H26.5完成		民12戸							
	s 港・岩崎地区	対象戸数: 23戸 (民23戸)				■H26.6完成		民23戸							
	t 泊地区	対象戸数: 13戸 (民13戸)	■H26.1完成		民13戸										
	u 浦浜南地区	対象戸数: 11戸 (民11戸)				■H26.12完成		民11戸							
	v 浦浜仲・西地区	対象戸数: 10戸 (民10戸)				■H26.12完成		民10戸							
	w 浦浜東・南嶺地区	対象戸数: 9戸 (民9戸)				■H27.3完成		民9戸							
	x 崎浜地区	対象戸数: 21戸 (民21戸)				■H27.6完成		民21戸							
	津波復興拠点	y 大船渡地区	区域面積: 約2.3ha (先行整備区域)	用地、設計等			★工事								
			区域面積: 約5.4ha (第2段階整備区域)	用地、設計等			★工事								
	漁業集落防災機能強化	z 越喜来地区	対象戸数: 30戸 (民30戸)	用地、設計等			★工事								

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市3/5】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

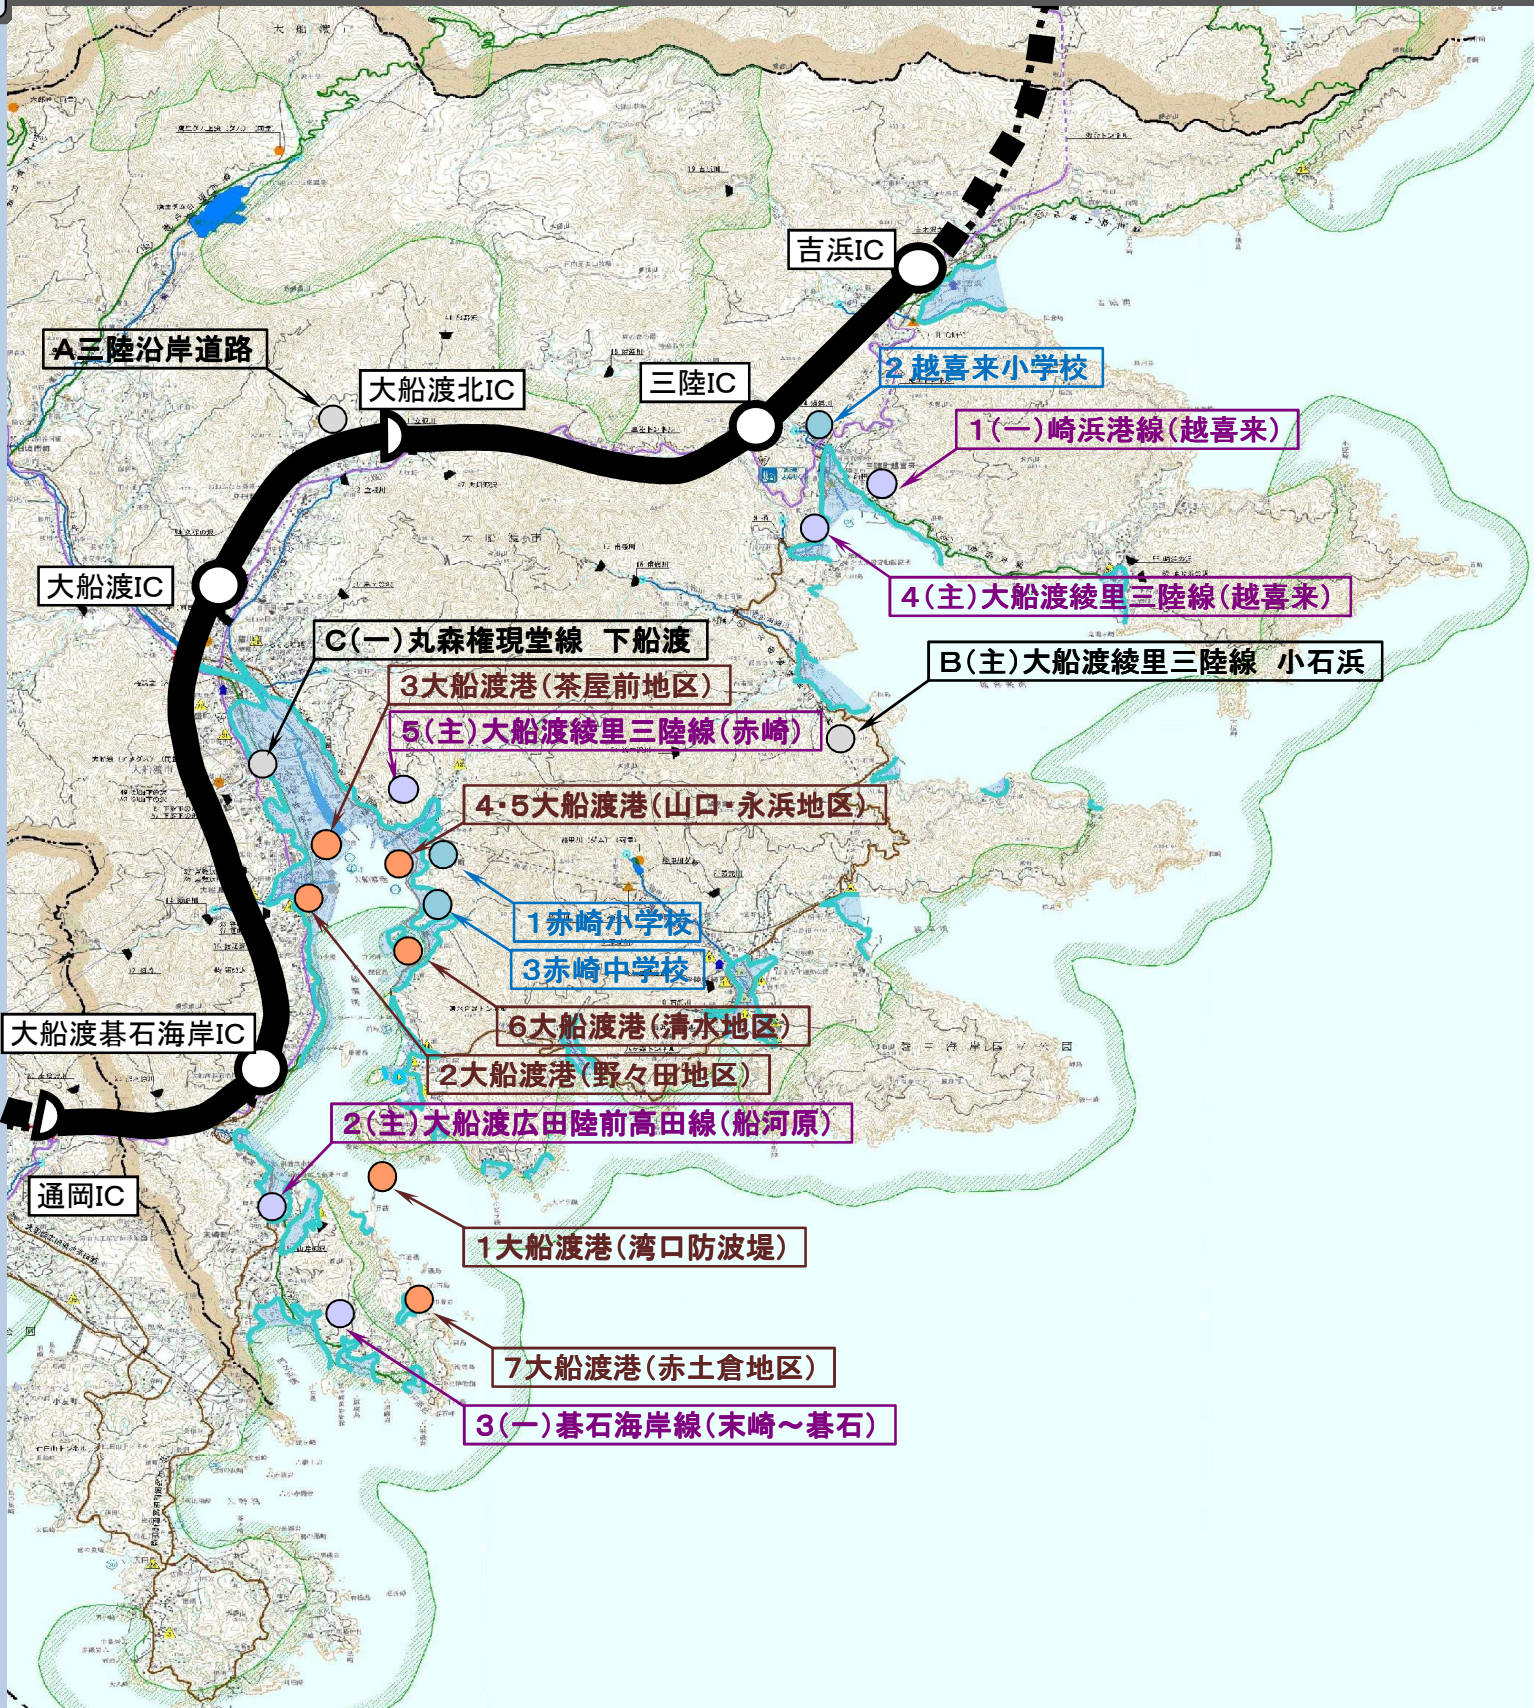


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)					第3期 (更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29
復興 まちづくり	まちづくり 連携道路	県	1 (一)崎浜港線	越喜来					◆H27.4着工 ★工事					
			2 (主)大船渡広田 陸前高田線	船河原				測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
			3 (一)碁石海岸線	末崎～碁石				測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
			4 (主)大船渡 綾里三陸線	越喜来				★用地買収、工事等 ◆H27.4着工						
			5 (主)大船渡 綾里三陸線	赤崎				測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
復興道路 等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	吉浜釜石道路 (吉浜～釜石)				★用地買収、工事等 ◆H25.2.25起工式						
				吉浜道路				■H27.11.29供用開始						
	復興関連道路	県	B (主)大船渡 綾里三陸線	小石浜				★工事 ◆H25.4着工						
			C (一) 丸森権現堂線	下船渡				測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
港 湾	大船渡港	県	1 湾口防波堤	(直轄災害復旧) 防波堤L=535m				★工事(平成28年度完成予定)						
			2 野々田地区	(災害復旧) 防波堤L=170m、 須崎防波堤L=60m、 -4.5m岸壁L=150m、 -3.0m物揚場L=87m他				■H28.3完成						
			3 茶屋前地区	(災害復旧) -9.0m岸壁L=428m、 -6.0m岸壁L=105m、 -3.0m物揚場L=376m、 -4.0m物揚場L=197m他				■H28.3完成						
			4 山口地区	(災害復旧) 防波堤L=64m、 さん橋(-2.0m)L=32m、 物揚場L=70m他			★工事							
			5 永浜地区	(災害復旧) 防波堤L=192m、 -2.0m物揚場L=108m、 -2.0m2号物揚場138m			★工事							
			6 清水地区	(災害復旧) 防波堤L=109m、 物揚場L=285m、 船揚場L=98m			★工事							
			7 赤土倉地区	(災害復旧) 南防波堤L=79m、 北防波堤L=165m、 -2.0m2号物揚場 L=104m他			■H28.3完成							
教 育	小学校	市	1 赤崎小学校	(災害復旧) 移転			用地、設計等・工事	★工事				移転完了まで蛸ノ浦小を使用		
			2 越喜来小学校	(災害復旧) 移転			用地、設計等	★工事				H24 甫嶺小、崎浜小と統合 移転完了まで旧甫嶺小を使用		
	中学校	3 赤崎中学校	(災害復旧) 移転			用地、設計等・工事	★工事				移転完了まで仮設校舎を使用			

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市4/5】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

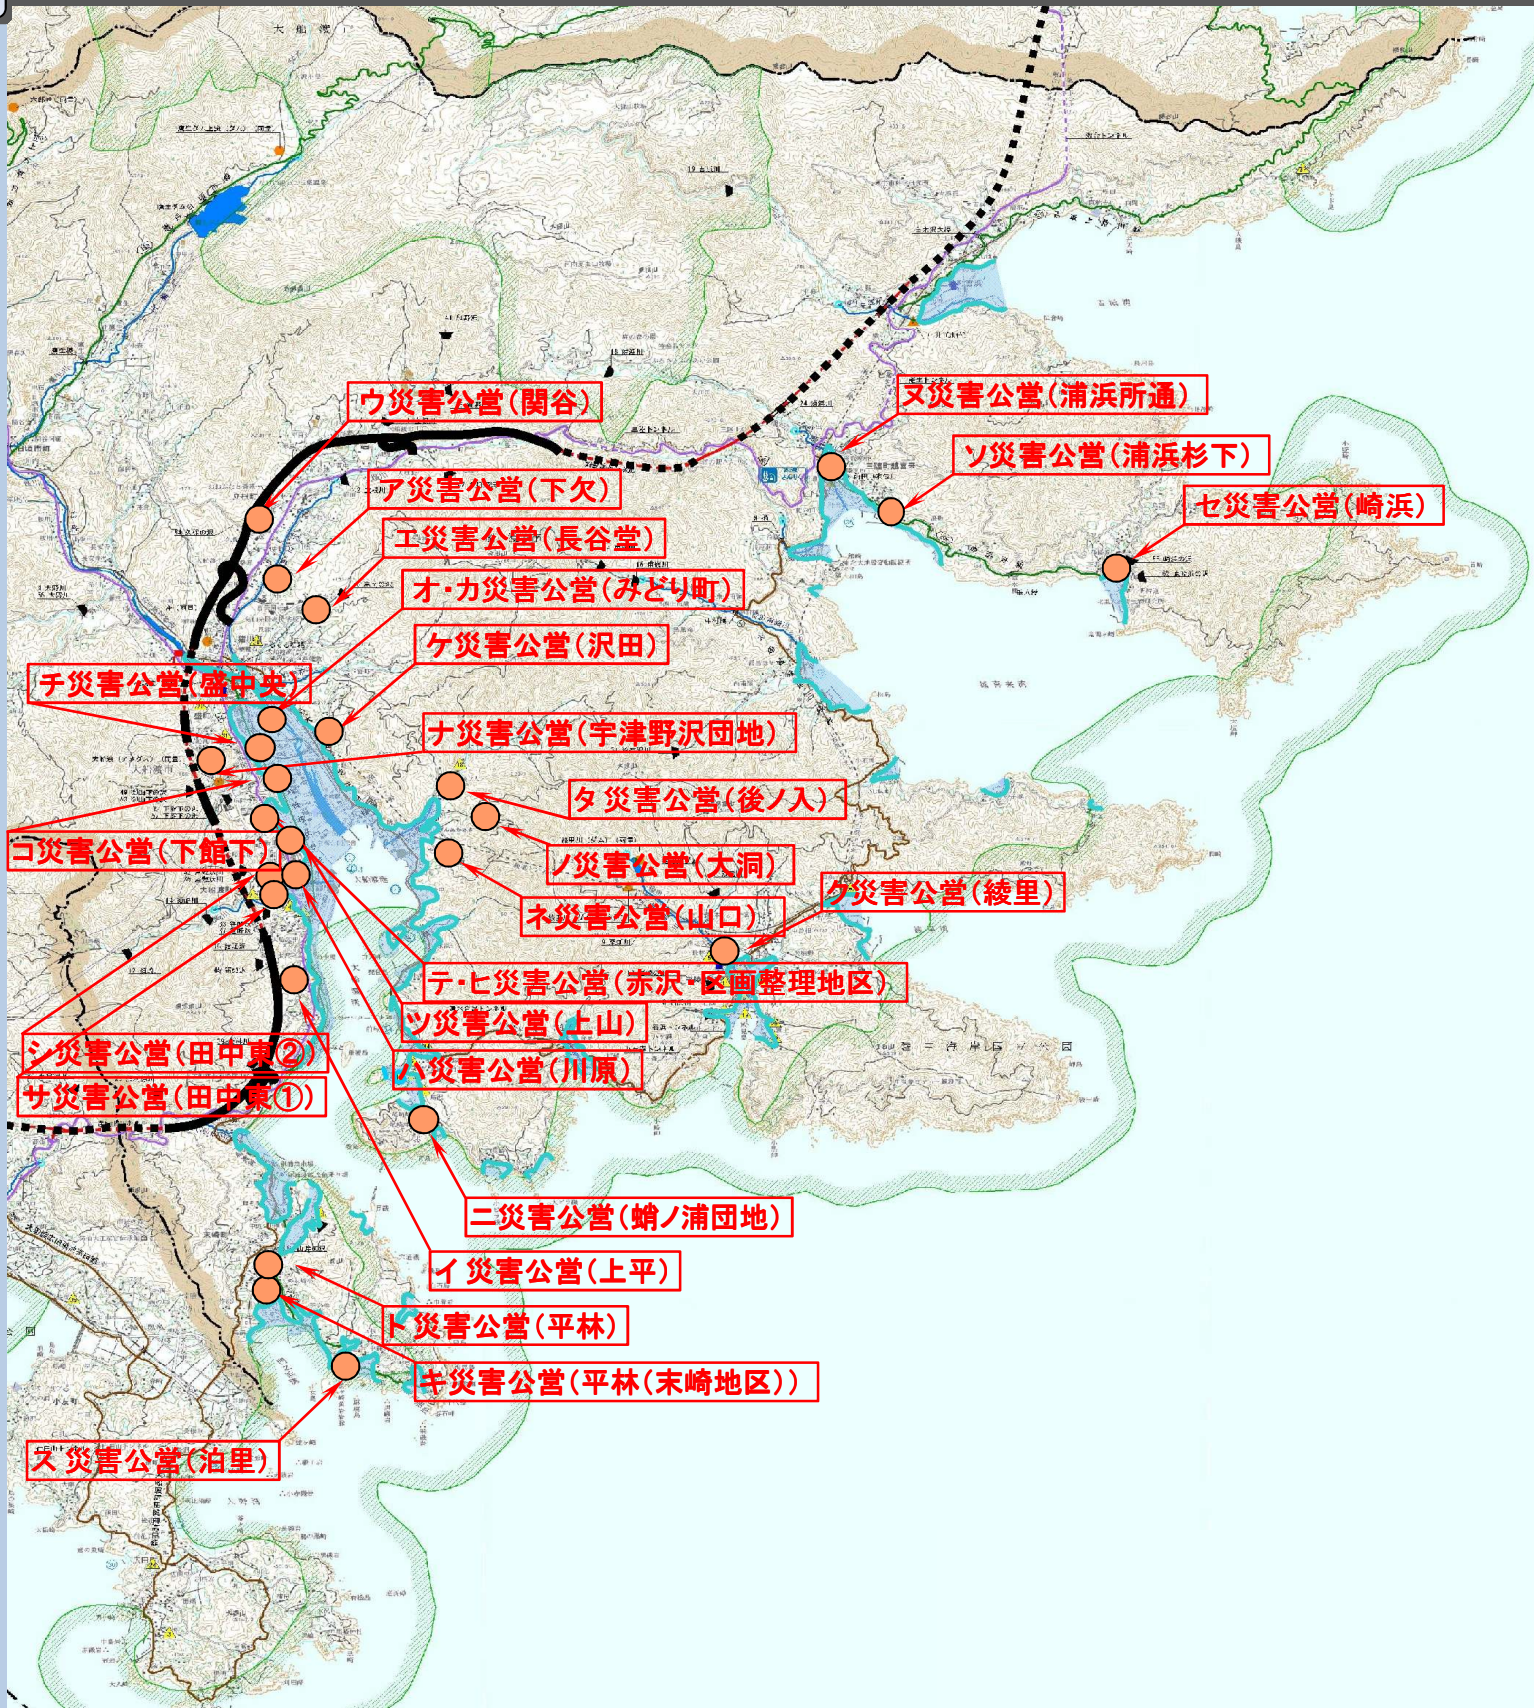


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					H23	H24	H25	H26		H27	H28		H29	H30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
災害公営住宅	直接建設	県	ア 下欠 (単独)	RC造3階 戸数:33戸					■H27.1完成	33戸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市5/5】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

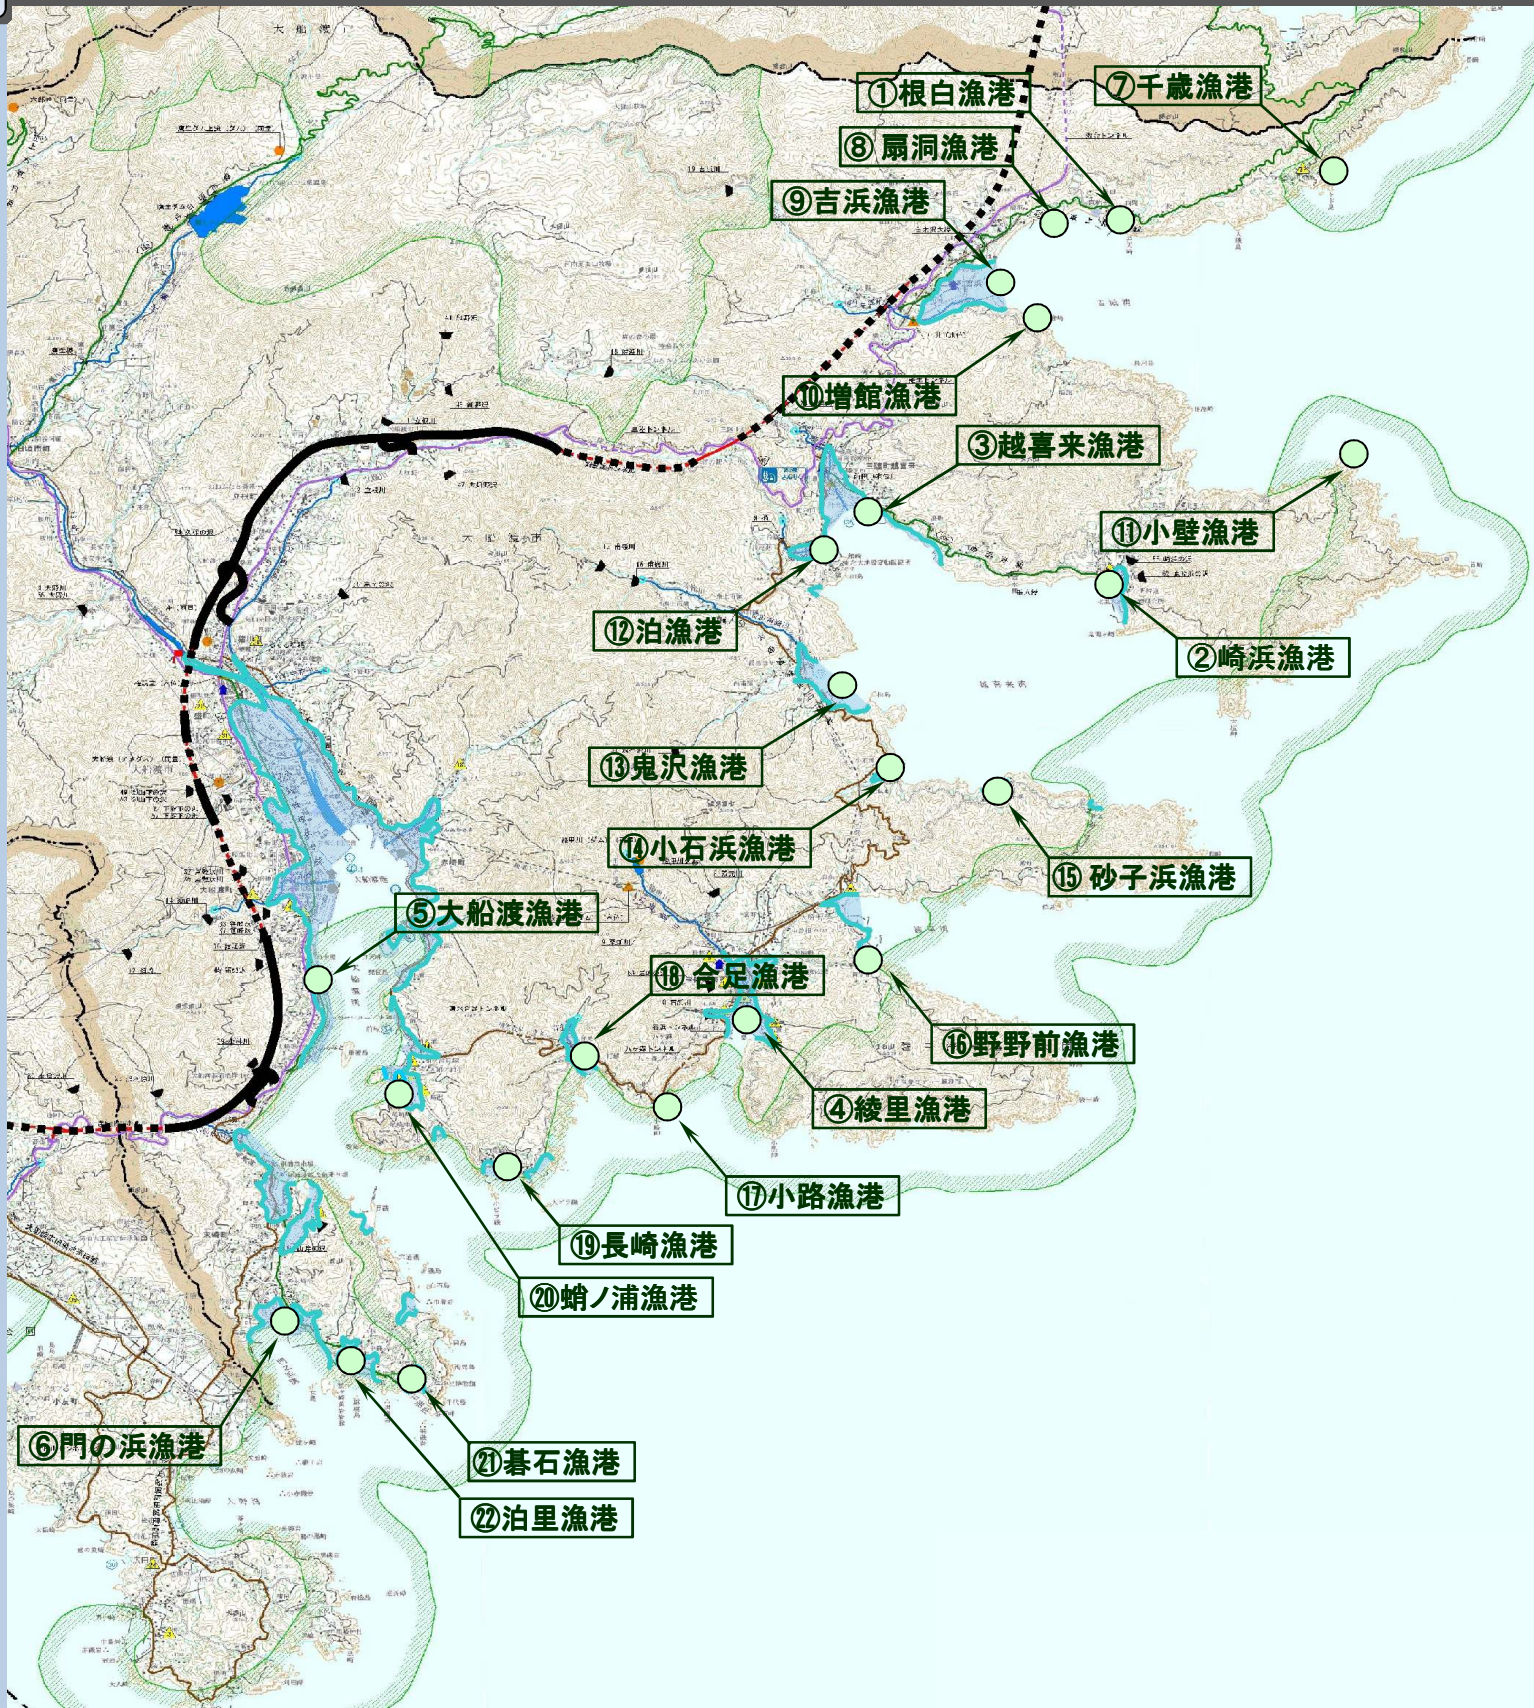


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)		第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
県			① 根白漁港	(漁港災害) 防波堤L=748m、 岸壁L=638m 他					■H28.3完成					
			② 崎浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=721m、 岸壁L=827m 他					■H28.3完成					
			③ 越喜来漁港	(漁港災害) 防波堤L=580m、 岸壁L=436m 他					■H28.3完成					
			④ 綾里漁港	(漁港災害) 防波堤L=402m、 岸壁L=1,102m 他					■H28.3完成					
			⑤ 大船渡漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,263m、 岸壁L=3,512m 他				★工事						
			⑥ 門の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=907m、 岸壁L=575m 他					■H28.3完成					
市	漁港	漁港	⑦ 千歳漁港	(漁港災害) 防波堤L=212m、 岸壁L=108m 他				★工事						
			⑧ 扇洞漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=23m 他			■H26.3完成							
			⑨ 吉浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=223m、 岸壁L=185m 他				★工事						
			⑩ 増館漁港	(漁港災害) 防波堤L=137m、 岸壁L=15m 他				★工事						
			⑪ 小壁漁港	(漁港災害) 岸壁L=44m 他				■H27.3完成						
			⑫ 泊漁港	(漁港災害) 防波堤L=283m、 岸壁L=202m 他					■H28.3完成					
			⑬ 鬼沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=329m、 岸壁L=209m 他				■H26.12完成						
			⑭ 小石浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=422m、 岸壁L=239m 他					■H28.3完成					
			⑮ 砂子浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=176m、 岸壁L=247m 他				★工事						
			⑯ 野野前漁港	(漁港災害) 防波堤L=781m、 岸壁L=484m 他				★工事						
			⑰ 小路漁港	(漁港災害) 防波堤L=162m、 岸壁L=65m 他					■H27.9完成					
			⑱ 合足漁港	(漁港災害) 防波堤L=81m、 岸壁L=45m 他					■H27.10完成					
			⑲ 長崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=482m、 岸壁L=475m 他				★工事						
			⑳ 蛸ノ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=239m、 岸壁L=972m 他				★工事						
			㉑ 基石漁港	(漁港災害) 防波堤L=123m、 岸壁L=104m 他				■H27.3完成						
			㉒ 泊里漁港	(漁港災害) 防波堤L=211m、 岸壁L=248m 他					■H28.3完成					

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市1/4】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

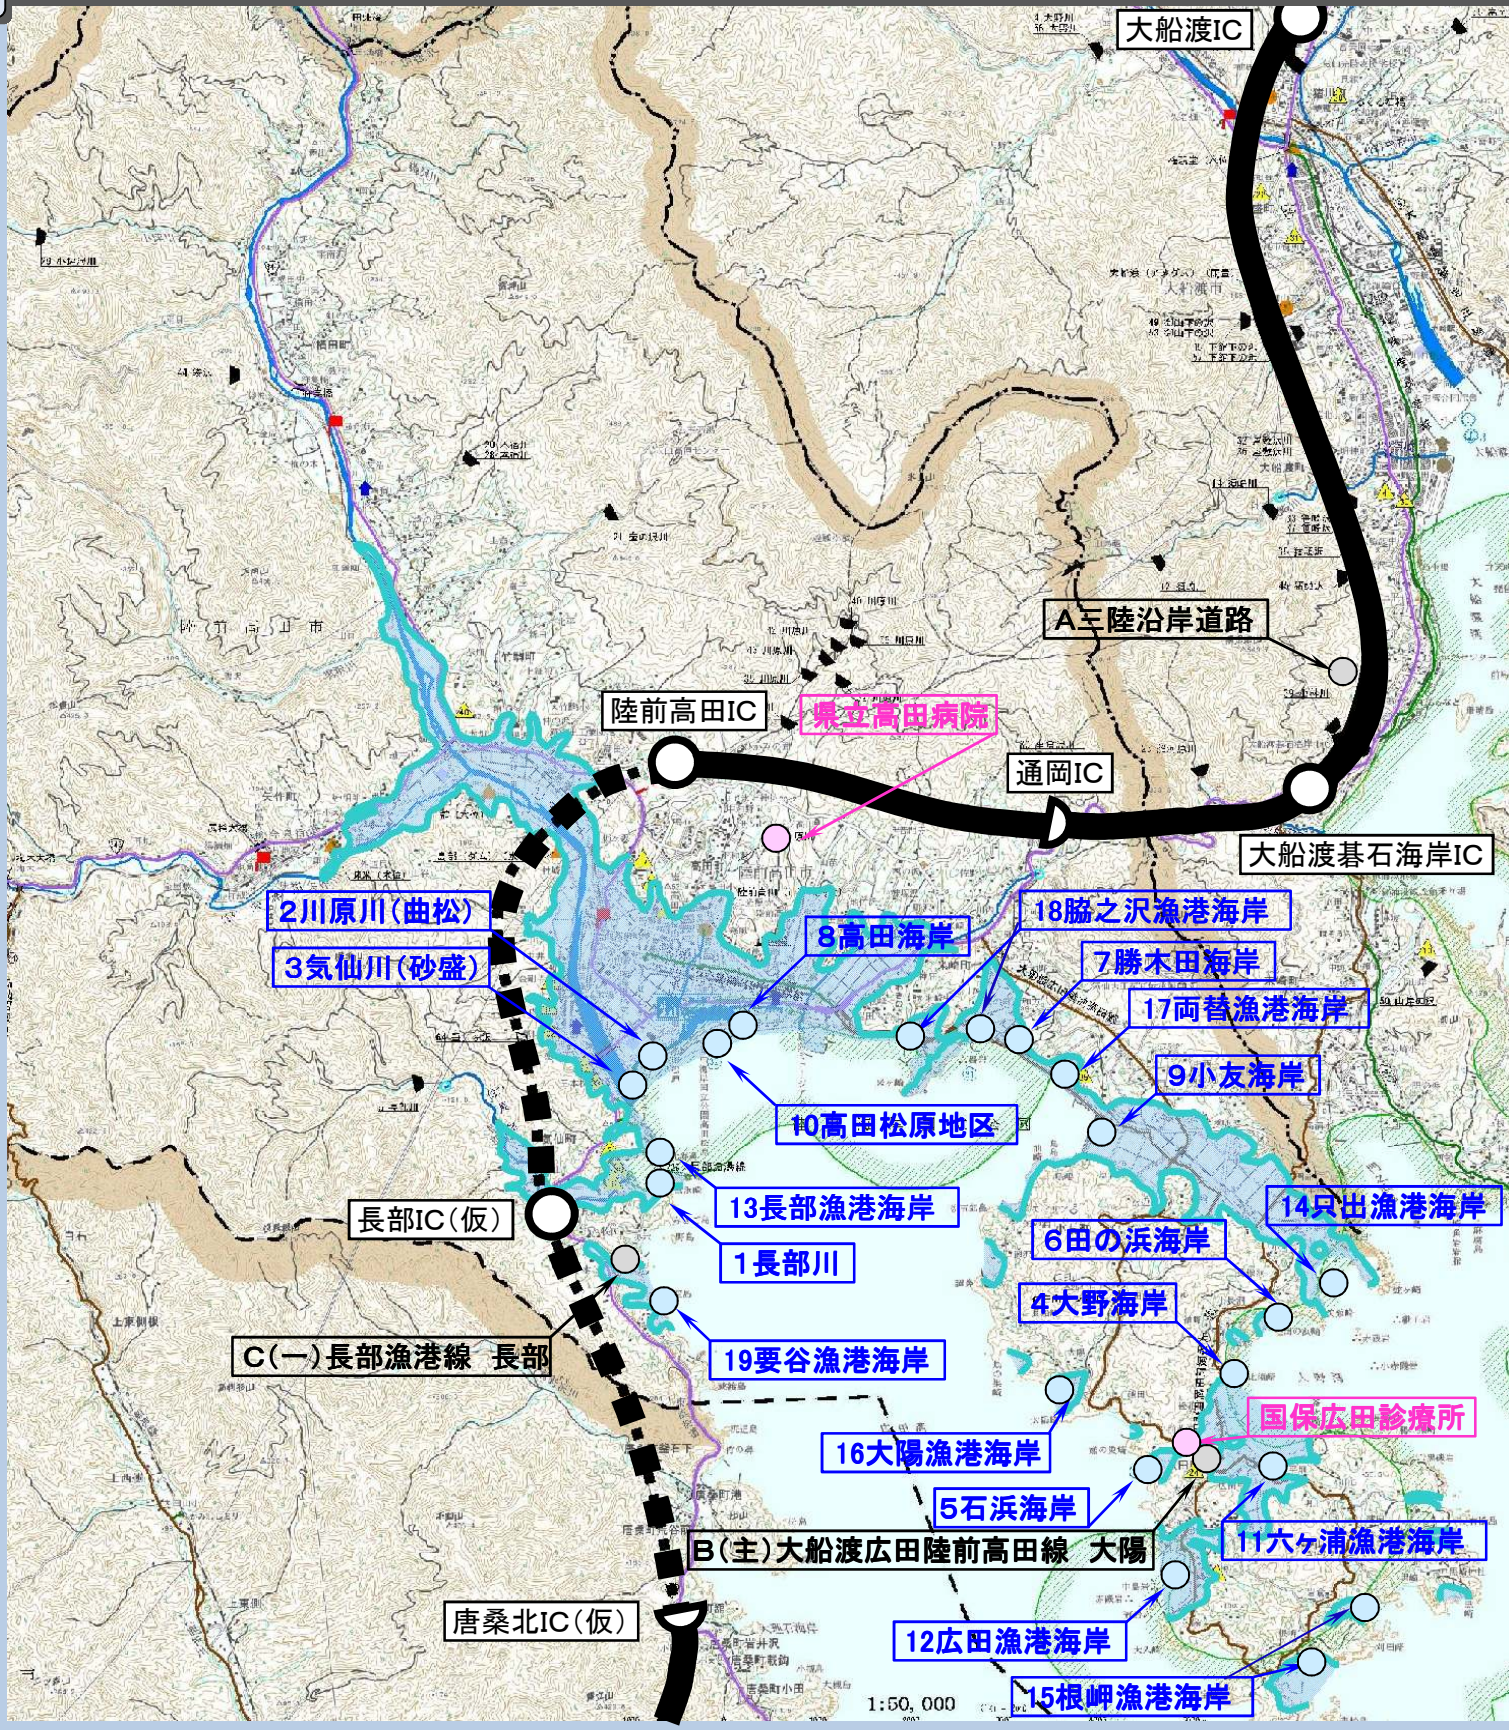


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30
海岸保全施設	一般海岸	県	1 長部川	(三陸高潮) 水門N=1基他	用地、設計等	★工事									
			2 川原川(曲松)	(災害復旧) 護岸工L=3.4km他	用地、設計等	★工事									
			3 気仙川(砂盛)	(災害復旧) 水門N=1基		★工事 H31完成予定									
			4 大野海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 離岸堤L=0.3km他	用地、設計等	★工事									
			5 石浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 離岸堤L=0.12km他	■H26.3完成										
			6 田の浜海岸	(災害復旧) 護岸工L=0.04km、 消波工L=0.02km他	■H25.1完成										
			7 勝木田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km他				■H28.3完成							
	農地海岸	県	8 高田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.9km、 水門N=1基、人工 リーフL=1.2km他	用地、設計等	★工事									
			9 小友海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=3基	用地、設計等	★工事									
	林野海岸	県	10 高田松原地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤) L=1.3km	用地、設計等	★工事									
			漁港海岸	市	11-1 六ヶ浦 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	用地、設計等	★工事							
	11-2 六ヶ浦 (本港地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他			用地、設計等	★工事									
	12-1 広田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、 水門N=10基 他			用地、設計等	★工事									
	12-2 広田 (後浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他			用地、設計等	★工事									
	13 長部漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他			用地、設計等	★工事									
	14 只出漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、 水門N=2基 他			用地、設計等	★工事									
	15 根岬漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km 他			用地、設計等	★工事									
	16 大陽漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=2基 他			用地、設計等	★工事									
	17 両替漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=3基 他			用地、設計等	★工事									
	18 脇之沢 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、 水門N=9基 他			用地、設計等	★工事 H32完成予定									
	19 要谷漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、 水門N=7基 他			用地、設計等	★工事									
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	高田道路 唐桑高田道路 (唐桑北～陸前高田)	■H26.3.23供用開始	★用地買収、工事等 ◆H25.2.6起工式									
			B (主) 大船渡広田 陸前高田線	大陽	★用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.6着工										
	復興関連道路	県	C (一) 長部漁港線	長部	■H24.8.24供用開始										
医療	病院	県	県立高田病院	病院(RC造) 合同公舎(RC造)	用地・設計等 工事										
	医科診療所	市	国保広田診療所	診療所施設整備	用地、設計等 工事										

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市2/4】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

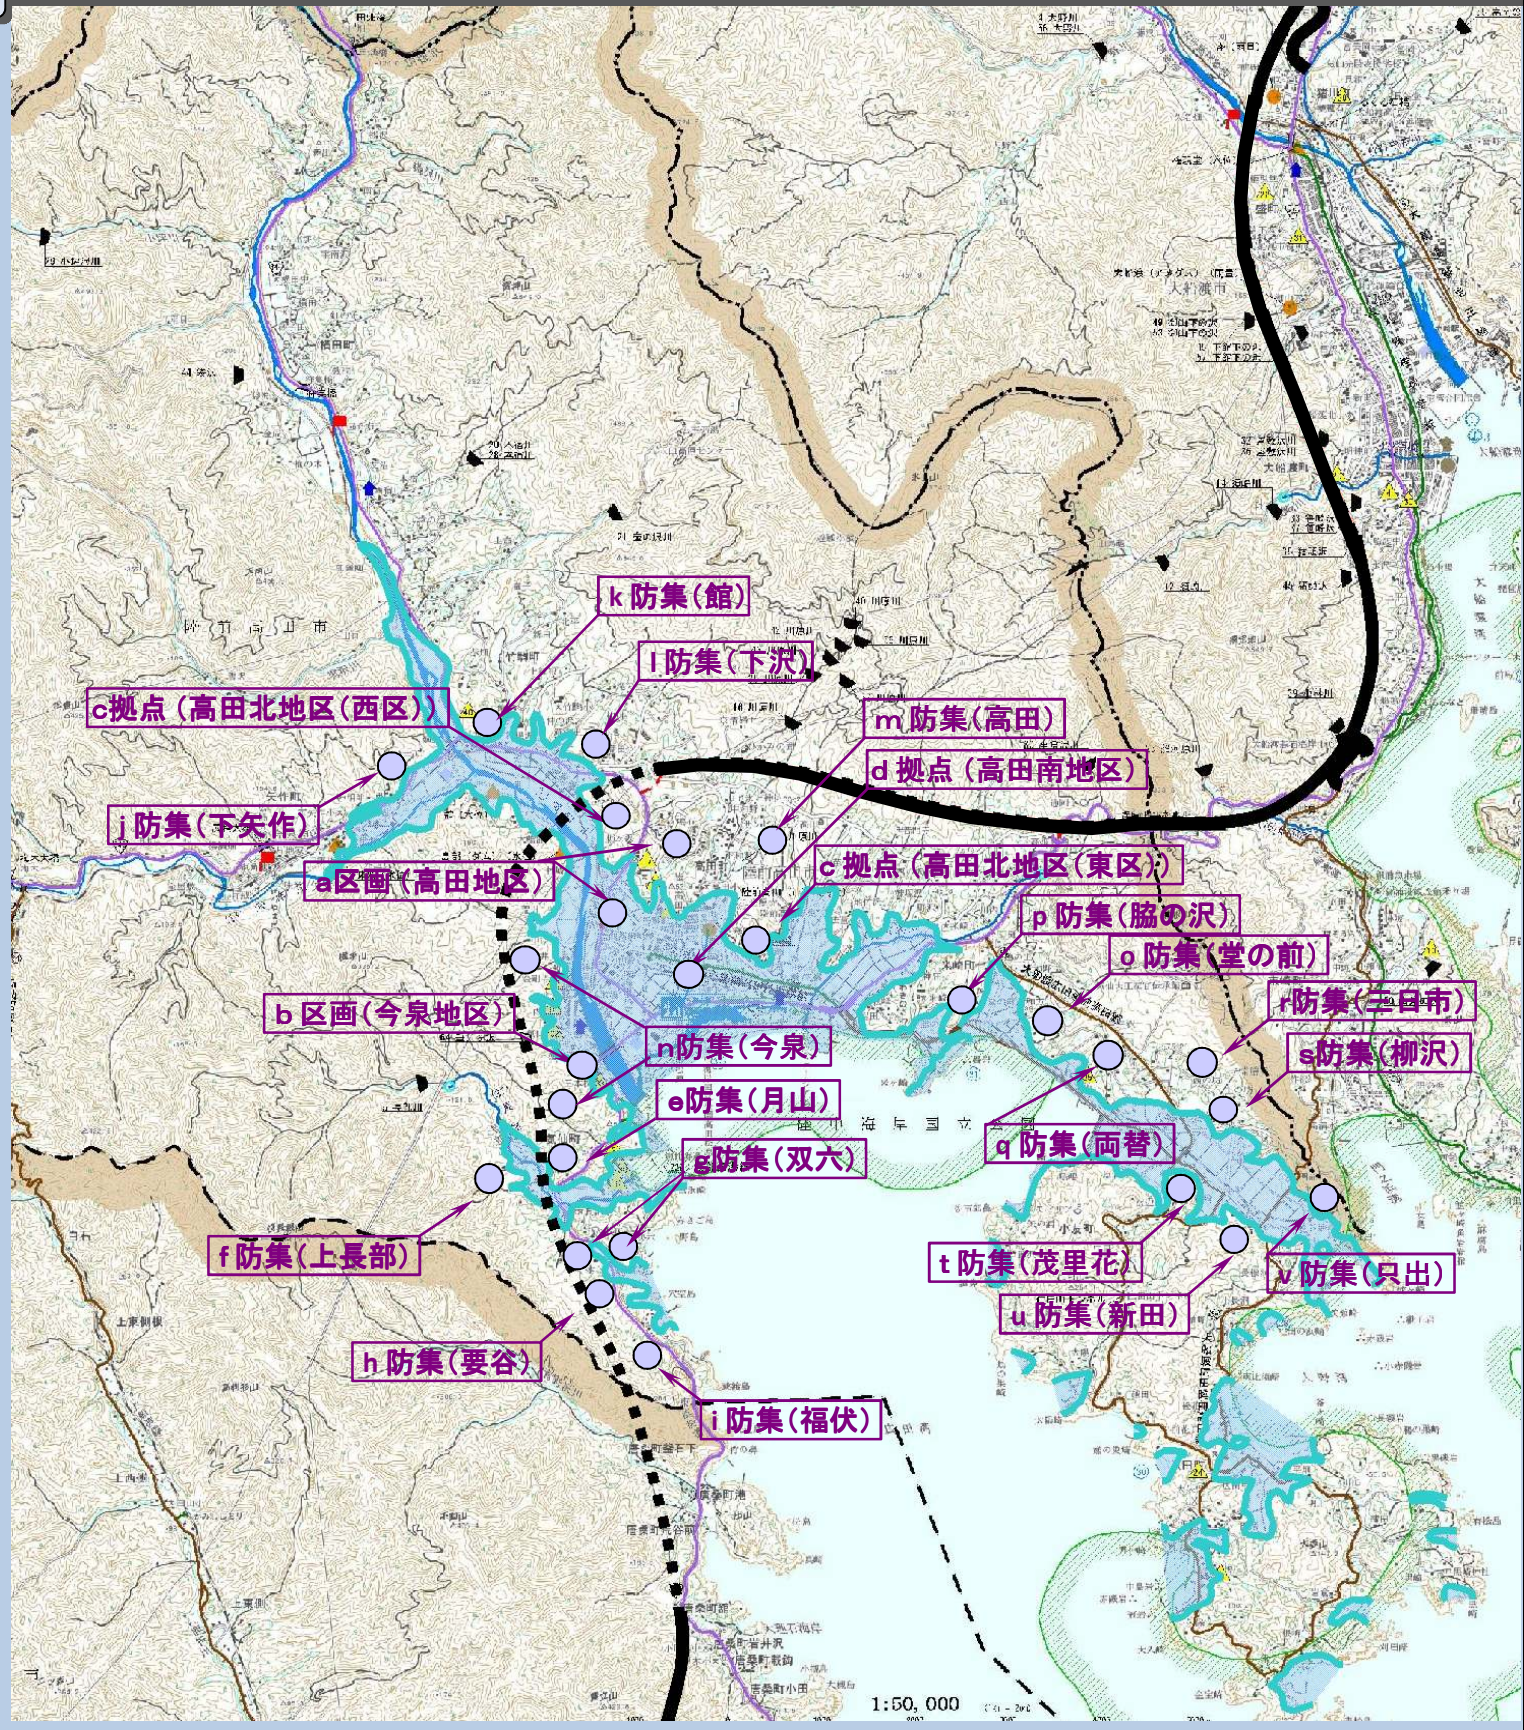


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)		第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	土地区画整理	市	a 高田地区	区域面積: 186.1ha 対象戸数1,481戸 (民1,361戸・公120戸)				用地、設計等	★工事					
			b 今泉地区	区域面積: 112.4ha 対象戸数485戸 (民411戸・公74戸)				用地、設計等	★工事					
	津波復興拠点	市	c 高田北地区	(西区) 区域面積: 9.6ha (東区) 区域面積: 9.1ha					■H28.3完成					
			d 高田南地区	区域面積: 19.8ha				用地、設計等	★工事					
	防災集団移転	市	e 長部地区 (月山)	対象戸数: 50戸 (民50戸)					■H27.8完成					
			f 長部地区 (上長部)	対象戸数: 17戸 (民17戸)			民17戸	■H26.1完成						
			g 長部地区 (双六)	対象戸数: 12戸 (民12戸)			民3戸		民3戸	■H27.6完成				
			h 長部地区 (要谷)	対象戸数: 7戸 (民7戸)			民7戸	■H25.12完成						
			i 長部地区 (福伏)	対象戸数: 5戸 (民5戸)					民5戸	■H26.12完成				
			j 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (下矢作)	対象戸数: 6戸 (民6戸)					民6戸	■H26.8完成				
			k 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (館)	対象戸数: 8戸 (民8戸)					民8戸	■H26.10完成				
			l 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (下沢)	対象戸数: 5戸 (民5戸)					民5戸	■H27.2完成				
			m 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (高田)	対象戸数: 79戸 (民79戸)					民2戸				民77戸	
			n 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (今泉)	対象戸数: 75戸 (民75戸)									民75戸	
			o 米崎地区 (堂の前)	対象戸数: 5戸 (民5戸)			民5戸	■H25.9完成						
			p 米崎地区 (脇の沢)	対象戸数: 69戸 (民69戸)						民69戸	■H27.10完成			
			q 小友地区 (両替)	対象戸数: 14戸 (民14戸)						民14戸	■H26.4完成			
			r 小友地区 (三日市)	対象戸数: 5戸 (民5戸)			民5戸	■H25.11完成						
			s 小友地区 (柳沢)	対象戸数: 9戸 (民9戸)						民9戸	■H27.3完成			
			t 小友地区 (茂里花)	対象戸数: 5戸 (民5戸)						民5戸	■H27.3完成			
			u 小友地区 (新田)	対象戸数: 7戸 (民7戸)			民7戸	■H26.3完成						
			v 小友地区 (只出)	対象戸数: 11戸 (民11戸)						民11戸	■H26.5完成			

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市4/4】

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）


「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

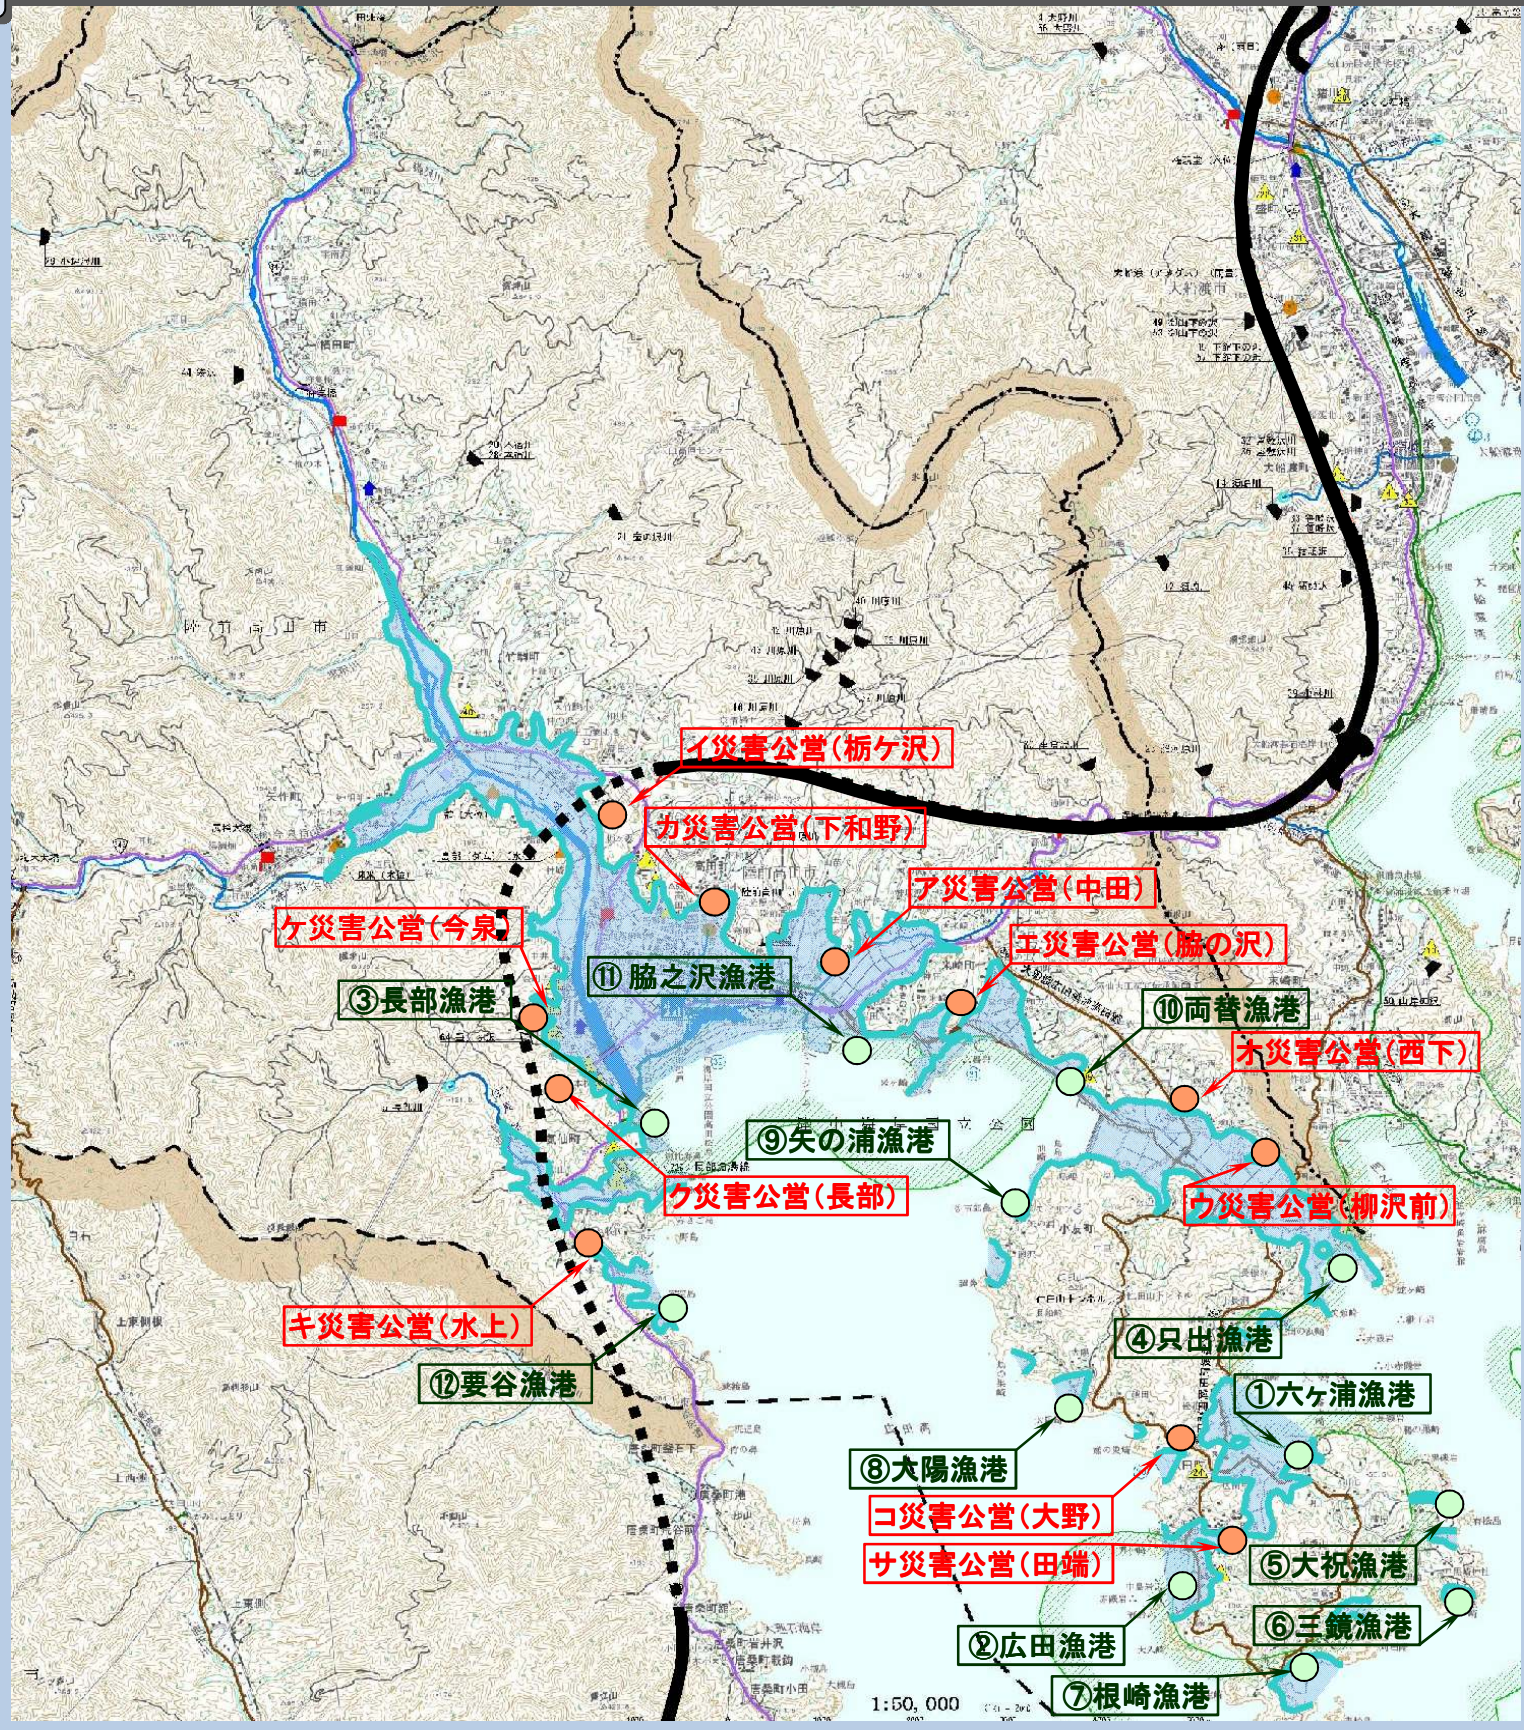

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基礎復興期間)		第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
災害公営住宅	直接建設	県	ア 中田 (単独)	RC造8階 戸数:197戸					■H27.9完成	197戸				
			イ 柳ヶ沢 (単独)	RC造9階 戸数:301戸		用地、設計等			★工事		301戸			
			ウ 柳沢前 (単独)	RC造3階 戸数:28戸				■H27.3完成	28戸					
			エ 脇の沢 (単独)	RC造3階 戸数:60戸			用地、設計等			★工事		60戸		
	設計・施工一括選定	市	オ 西下 (単独)	RC造4階 戸数:40戸				■H26.12完成	40戸					
			カ 下和野 (区:高田地区)	RC造7階 戸数:120戸				■H26.9完成	120戸					
			キ 水上 (単独)	RC造3階 戸数:30戸				■H26.12完成	30戸					
			ク 長部 (区:今泉地区)	RC造3階 戸数:13戸		用地、設計等				★工事		13戸		
			ケ 今泉 (区:今泉地区)	RC造3階 戸数:61戸		用地、設計等				★工事		61戸		
			コ 大野 (単独)	RC造3階 戸数:31戸						■H28.3完成		31戸		
漁港	漁港	県	① 六ヶ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=601m、 岸壁L=474m 他					■H28.3完成					
			② 広田漁港	(漁港災害) 防波堤L=919m、 岸壁L=1,176m 他					■H28.3完成					
			③ 長部漁港	(漁港災害) 防波堤L=408m、 岸壁L=1,180m 他					■H28.3完成					
			④ 只出漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、 岸壁L=298m 他					■H28.3完成					
			⑤ 大祝漁港	(漁港災害) 防波堤L=99m、 岸壁L=43m 他		用地、設計等			★工事					
			⑥ 三鏡漁港	(漁港災害) 防波堤L=14m、 岸壁L=36m 他		用地、設計等			★工事					
			⑦ 根岬漁港	(漁港災害) 防波堤L=354m、 岸壁L=150m 他					■H28.3完成					
			⑧ 大陽漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、 岸壁L=79m 他					■H28.3完成					
			⑨ 矢の浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=136m、 岸壁L=183m 他		用地、設計等			★工事					
			⑩ 両替漁港	(漁港災害) 防波堤L=274m、 岸壁L=254m 他		用地、設計等			★工事					
			⑪ 脇の沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,149m、 岸壁L=531m 他		用地、設計等			★工事					
			⑫ 要谷漁港	(漁港災害) 防波堤L=556m、 岸壁L=279m 他					■H28.3完成					
	市	市	① 六ヶ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=601m、 岸壁L=474m 他					■H28.3完成					
			② 広田漁港	(漁港災害) 防波堤L=919m、 岸壁L=1,176m 他					■H28.3完成					
			③ 長部漁港	(漁港災害) 防波堤L=408m、 岸壁L=1,180m 他					■H28.3完成					
			④ 只出漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、 岸壁L=298m 他					■H28.3完成					
			⑤ 大祝漁港	(漁港災害) 防波堤L=99m、 岸壁L=43m 他		用地、設計等			★工事					
			⑥ 三鏡漁港	(漁港災害) 防波堤L=14m、 岸壁L=36m 他		用地、設計等			★工事					

基準日：平成28年3月31日（平成28年4月26日公表）

ア災害公営(一関市沢内)



分野区分	細分項目等	事業主体	市町村名 路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール												
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)					
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30		
災害公営住宅	直接建設	市	一関市 沢内 (単独)	RC造3階 戸数:27戸					用地、設計等				27戸				
★工事																	
区分	種 別	路線名	番号	市町村名	箇所名	年度別整備スケジュール											
						第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)				
						H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30	
直轄事業	復興道路	東北横断自動車道 釜石秋田線	A	遠野市	遠野道路 (遠野住田～遠野)	★用地買収、工事等 ◆H25.6.16起工式											
			B	遠野市	遠野～宮守												
			C	遠野市 ～花巻市	宮守～東和	■H24.11.25供用開始											
		宮古盛岡横断道路	D	宮古市 ～盛岡市	区界道路 (区界～築川)	★用地買収、工事等 ◆H26.8.24起工式											
			E	盛岡市	都南川目道路	★用地買収、工事等 ※川目IC～田の沢IC ◆H26.3.12供用開始、田の沢IC～手代森IC H31開通予定											
県事業	復興道路	宮古盛岡横断道路	a	盛岡市	築川道路	■H25.3.10供用開始											
			一般国道106号 (ICへアクセスする道路)	1	盛岡市	川目	■H25.3.10供用開始										
				国道107号	2	奥州市	札押道路	■H23.10.26供用開始									
		3	奥州市		梁川～口内	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
		国道281号	4	岩手町	大坊	★工事											
			5	岩手町	大坊の2	★用地買収、工事等 ◆H27.10着工											
		国道283号	6	遠野市	上郷道路												
			国道284号	7	一関市	真滝BP	■H24.8.7供用開始										
		8		一関市	壺根BP	★工事											
		9		一関市	石法華	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
		国道340号	10	遠野市	土淵BP	■H24.7.22一部供用開始 ■H25.12.25供用開始											
			11	遠野市 (宮古市)	立丸峠 ※宮古市の復興支援道路・国道340号立丸峠と同一箇所	◆H26.3着工	★工事										
			12	九戸村	泥ノ木	■H27.1.16供用開始											
			13	軽米町	駒板												
			14	住田町	山谷	★用地買収、工事等 ◆H27.9着工											
			15	葛巻町	四日市												
			16	九戸村	長興寺	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
			17	住田町	葉山～恵蘇	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
		国道342号	18	一関市	花泉BP	■H23.11.29一部供用開始 ■H26.8.30供用開始											
			19	一関市	白崖	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
		国道343号	20	一関市	大原	■H26.3.28供用開始											
			21	一関市	一ノ通												
			22	一関市	洪民	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
		国道395号	23	軽米町	赤石峠												
		国道396号	24	遠野市	上宮守	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手											
		国道397号	25	住田町	子飼沢	■H25.9.30供用開始											
			26	奥州市	分限城～赤金	★工事											
			27	住田町	高屋敷	★工事											
			28	住田町	津付道路	■H26.10.26供用開始											
			29	奥州市	小谷木橋	★用地買収、工事等 ◆H27.9着工											
		(一)遠野住田線 (ICへアクセスする道路)	30	遠野市	新里												
						■H27.12.5供用開始											
